USAID | PERU
DEL PUEBLO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

UNODC
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito

INFORME DE MONITOREO DESARROLLO ALTERNATIVO MARZO 2012

(Convenio UNODC/USAID)

Proyecto:
"Desarrollo Alternativo en Distrito de Pólvora -Tocache, San Martín y Consolidación y Expansión de Actividades en San Martín, Huánuco y Ucayali"

INFORME DE AVANCE

En Marzo se implementó el control de entregas de fertilizantes a los productores de calificados por las unidades técnicas del Proyecto en Tocache y Bolsón de Cuchara. Asimismo, se coordino con APROSAN-ASLUSA y ACEPAT-OLPESA para el control respectivo, estas organizaciones reportan en sus almacenes 150 TM y 663.5 TM de fertilizantes, respectivamente, que será distribuidas a los productores en Abril Próximo.

En Paraíso, Provincia de Marañón, Región Huánuco, se creó la quinta organización de productores de palma aceitera de pequeños productores, bajo el nombre de Asociación Central de Palmicultores de Nuevo Paraíso (ACEPALP), entidad que cuenta con Estatutos aprobados por sus socios. De acuerdo al Resultado 2.6 del Proyecto Tocache IV Etapa, en el primer semestre del presente año se prevé contar con el estudio de factibilidad para la implementación de la planta de extracción de aceite crudo.

Las condiciones sociopolíticas se mostraron calmos en todos las zonas de trabajo del Proyecto, escenario que favoreció para que diversos medios de la prensa local, regional y nacional constaten *en situ* los avances del Desarrollo Alternativo en las zonas consideradas hasta hace algunos años atrás como de mayor conflictividad como Santa Rosa de Mishollo, Paraíso y Bolsón de Cuchara. En estas localidades, los agricultores, representantes de las organizaciones de productores y autoridades manifestaron a los medios de difusión masiva los beneficios de formar parte de alternativas económicas legales y sostenibles basadas en el desarrollo del café, cacao, palma aceitera y pijuayo, como medio para enfrentar la pobreza y extrema pobreza.

En los tres viveros para palma aceitera, la labores agronómicas contó con pleno apoyo de los productores calificados, al cierre del mes, se reporta un stock de 277,012 plántulas en pleno desarrollo, esto equivale una oferta de plantas de palma para instalar para 1,937 hectáreas, 21% más con relación a lo programado (1,600 hectáreas).

Estado situacional de las plantulas de palma aceitera en vivero

Vivero	Stock en Febrero	Merma*	Stock a Marzo
Paraíso	88,385	413	87,972
Aguaytía	67,468	711	66,757
Pongo de Caynarachi	122,283	0	122,283
Total	**278,136**	**1,124**	**277,012**

(*) Descarte por crecimiento irregular o problemas de ataques de plaga o enfermendad.

ZONA 01: CONSOLIDACIÓN DE LAS FASES I-II Y III EN LAS PROVINCIAS DE TOCACHE, MARISCAL CÁCERES Y MARAÑON

La Municipalidad del Distrito de Nuevo Progreso, como Unidad Ejecutora, presentó el Proyecto: ***"Ampliación y Desarrollo de Capacidades para Incrementar la Productividad y Mejorar el Grano de cultivo del Cacao"***, que cuenta con financiamiento de DEVIDA.

La Municipalidad Distrital de Pólvora mediante Ordenanza Municipal declaro en estado crítico en su jurisdicción al cultivo de la palma aceitera, debido a la alta incidencia de la enfermedad definida como Marchitez Sorpresiva. En este sentido, la Unidad de Sanidad de la empresa OLPESA, que evaluó 311 parcelas con 1,290.56 hectáreas de palma aceitera, identifico y eliminó plantones afectadas con la Marchitez Sorpresiva en 1,472 plantas (10.29 ha), manchas anulares (0.12 hectáreas en 17 plantas, anillo rojo/hoja en 06 plantas (0.04 ha).

En Marzo, por líneas de intervención se realizaron los principales avances:

a. Palma aceitera

Mantenimiento de 501 hectáreas en Tocache (III Etapa), el equipo técnico supervisó las labores de limpieza de círculos en 210 hectáreas y limpieza de interlíneas en 151 hectáreas, actividades que muestran una incidencia con relación al área total de 42% y 30%, respectivamente. En términos acumulados las labores de limpieza de círculos se realizó en 669 hectáreas y mantenimiento de interlíneas en 510 hectáreas.
El primer abonamiento de las plantaciones de palma en el presente año está previsto para Abril próximo.

Con excepción del precio del aceite de palma que se incrementó en promedio en 2% con respecto a Febrero que llegó a US$ 1,079/TM, en el resto de los productos como racimos de fruta fresca y palmiste se mantuvieron estables.

Precio de principales productos de la palma aceitera en Tocache (US$/TM)

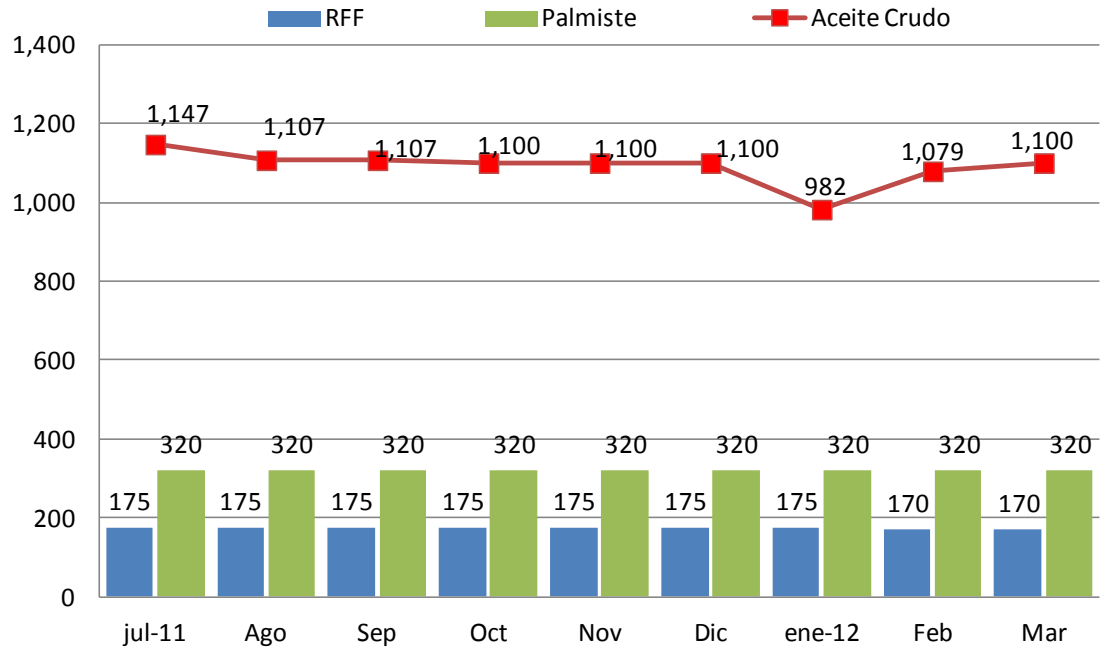

Mantenimiento de 999 hectáreas en Paraíso (III Etapa), se supervisaron las labores de limpieza de círculos en 371 hectáreas y mantenimiento de interlíneas en 314 hectáreas, en términos acumulados se registra un avance de 833 hectáreas y 673 hectáreas, respectivamente.

En trabajo conjunto con los productores beneficiarios de las zonas de El Dorado y Paraíso, UNODC en Tocache y ex miembros de ACEPAT se conformó la Asociación Central de Palmicultores de Nuevo Paraíso (ACEPALP) y elaboró los Estatutos correspondientes de la nueva organización. El 31 de Marzo del 2012, en la Municipalidad del Centro Poblado de Paraíso los productores aprobaron los Estatutos de ACEPALP y nombraron la primera junta directiva integrada por los siguientes señores:

- Presidente, Alejandro Nájera Ramos.
- Vice-Presidente, Augusto Araujo Satalaya.
- Secretario, Josué Gonzales Buendía.
- Tesorero, Sara Quispe Castro.
- Fiscal, Celso Mozombite del Águila.
- Vocal 1, Witson Ramírez Díaz.
- Vocal 2, Emilio Estela Fabián.

Ampliación de 500 hectáreas en Paraíso (fase vivero, IV Etapa), el equipo técnico junto con los 109 productores seleccionados para la fase de ampliación realizaron las siguientes actividades de mantenimiento de las plantas en vivero:

- Control de malezas en forma manual y aplicación de productos químicos en las bolsas y en las calles, nivel de cobertura 100% y 50%, respectivamente.
- Control de plagas y enfermedades con aplicación de productos químicos en el 1005 de los plantones.
- Eliminación de tinglado en 4 hectáreas, en términos acumulados la cobertura de esta actividad llegó a 100% (5 ha).
- Incorporación de mulch de cascarilla de arroz en 53,375 plantas, nivel de avance 100% (88,385 plantas).

AVANCE DE LAS ACTIVIDADES A MARZO EN LA ZONA 01: TOCACHE - PARAÍSO

ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIA	META GLOBAL PROYECTO (POA 2012)	AVANCE FÍSICO A MARZO 2012	LOGRO ACUMULADO A MARZO 2012 (%)	SEMAFORO
1. Culminación de siembras de la III Etapa					
a. Tocache - San Martín	**Ha**	**1,501**	**1,491**	99%	
Palma aceitera	Ha	501	501	100%	
Cacao	Ha	800	800	100%	
Palmito	Ha	200	190	95%	
b. Paraiso-Huánuco					
Palma aceitera	Ha	999	999	100%	
2. Mantenimiento de plantaciones instaladas en la III Etapa					
a. Palma aceitera					
Tocache - San Martín					
Fertilización	Ha	501	0	0%	
Aplicación de Boro	Ha	501	0	0%	
Paraiso-Huánuco					
Fertilización	Ha	999	0	0%	
Aplicación de Boro	Ha	999	0	0%	
b. cacao					
Injerto de patrones	Ha	**800**	**800**	100%	
Cacao CCN51	Ha	560	560	100%	
Cacao Fino Aromático	Ha	240	240	100%	
Reinjerto	Ha	80	31	39%	
Abonamiento de plantaciones	Ha	800	0	0%	
Uso de abonos foliares	N° de product	430	215	50%	
Preparación de compost	N° de product	430	396	92%	
Construcción de microrellenos sanitario	N° de predios	430	516	120%	
Construcción de letrinas	N° de predios	430	430	100%	
d. Pijuayo para palmito					
Abonamiento	Ha	**201.05**	**0.00**	**0%**	
Tocache	Ha	59.25	0	0%	
Uchiza	Ha	107.35	0	0%	
Nuevo Progreso	Ha	34.45	0	0%	

- Aplicación de urea (5 gramos/planta) para desarrollo de follaje.

Cabe indicar, que en Marzo se ***contabilizó en el vivero 87,972 plantas,*** cantidad menor en 413 plantas con relación a Febrero. Esta merma se debió por descarte natural para garantizar el buen desarrollo de otras plantas.

b. Cacao

La asistencia técnica se orientó a la supervisión de las siguientes labores agronómicas:

- Control de malezas en 224 hectáreas, en términos acumulados al primer trimestre totalizó 753 hectáreas. Nivel de avance, 94% con respecto a la meta esperada (800 ha).
- Supervisión de los injertos, actividad que determinó la necesidad de reinjertar 49 hectáreas, principalmente en las localidades de Buenos Aires (7 ha), Monteverde (6.5 ha), Monterrey (5 ha), entre otros. La irregularidad de las inundaciones afectaron los injertos de reciente data en las plantaciones de cacao.
- Siembra y recalce de sombra permanente en plantaciones de cacao, limitada provisión de plantones de especies forestales del Instituto Tecnológico de Tocache dificulta la culminación de esta actividad, hasta Marzo se muestra el siguiente avance:
  - ✓ 781 hectáreas instaladas con guaba, nivel de avance 98%.
  - ✓ 566.5 hectáreas instaladas con especies forestales de rápido crecimiento como bolaina, capirona y pino chuncho, nivel de avance 71%.
  - ✓ 548 hectáreas instaladas con especies de lento crecimiento como caoba, tornillo y mohena, nivel de avance 69%.
- Poda de formación en 747 hectáreas para garantizar crecimiento adecuado de la copa, nivel de avance 93%.
- Poda de mantenimiento en 311 hectáreas, en términos acumulados llegó a 663 hectáreas, nivel de avance 83%.

En 93% de las parcelas con cacao instaladas en la III Fase se realizaron podas de formación

- Podas fitosanitarias para control natural de plagas y enfermedades en 312.5 hectáreas, acumulado al primer trimestre 714 hectáreas, nivel de avance 89%.
- Manejo integrado de plagas en 303 hectáreas, que suman al primer trimestre 726 hectáreas, nivel de avance 91%.
- Abonamiento en 41.5 hectáreas que en términos acumulados sumó 735.5 hectáreas, nivel de avance 92%. Cabe destacar que abonamiento realizado en Marzo y el resto que aún falta por abonar corresponden a la actividad del 2011.
- Mantenimiento de 430 letrinas, supervisión a 354 productores en la producción de compost, supervisión en la instalación de 45 microrellenos sanitarios y supervisión en la preparación de abonos orgánicos y foliares a 215 productores.

Ampliación de 200 hectáreas nuevas de cacao en Santa Rosa de Mishollo, las actividades agronómicas supervisadas por los técnicos del Proyecto son los siguientes:

- Manejo de sombra temporal (plátano) en las 200 hectáreas que consistió en control de malezas, poda fitosanitaria, recalce y aplicación de abono foliar preparado por los propios agricultores.
- Mantenimiento de plantones de cacao en vivero para recalce, que consistió en deshierbo, control fitosanitario, riegos, etc. En las 06 localidades se identificó un total de 20 hectáreas destinados para reposición. Cabe destacar que a Marzo se reportó la producción de 261,700 plantones de cacao, de ello, 97% están instaladas en campo definitivo.
- Instalación de plantones de cacao en 10 hectáreas, que suma al acumulado a 194 hectáreas, nivel de avance 97%. Las comunidades de Santa Rosa de Mishollo y Los Ángeles explican 49% de las áreas instaladas hasta Marzo.
- Supervisión en la preparación de abonos foliares en el 100% de los agricultores participantes en el Proyecto (119), supervisión en la instalación de letrinas en 97 predios de un total de 119, supervisión en la preparación de composteras en 7 predios (5.9% de avance) y supervisión

Manejo de sombra temporal en 200 hectáreas instaladas en la IV Fase para cacao

en la instalación de microrellenos sanitarios en 104 predios (87% de avance).

c. Pijuayo para palmito

Mantenimiento de 190 hectáreas instaladas en la III Fase, la asistencia técnica se desarrollo con normalidad, se supervisó principalmente las labores de labores de deshierbo en 135.15 hectáreas de un total de 190 hectáreas. No se evidencia inversión por parte del agricultor en la compra de herbicidas, el deshierbo se realizó en forma manual, situación que limita mayor avance de esta actividad.

Para la presente campaña, existe expectativas favorables para mejorar el precio de compra de la materia prima, debido a las coordinaciones que realizan APROSAN Y ASLUSA, ante el bajo nivel de acopio de chonta para el proceso.

d. Apoyo a organizaciones de productores en Tocache

Instalación de 20 hectáreas de pijuayo para semilleros en Tocache, el equipo técnico supervisó las siguientes labores agronómicas:

- Mantenimiento de los plantones de pijuayo en viveros instalados en parcelas de 14 productores en Uchiza y Nuevo Progreso.
- Instalación de plantones de pijuyao en 06 hectáreas en las comunidades de Jorge Chávez, Porvenir, Los Ángeles y San Pedro, nivel de avance 30% con respecto a la meta programada (20 hectáreas).

Cabe destacar, que los plantones en vivero muestran un buen desarrollo agronómico y fitosanitario en los viveros. Entre Abril y Mayo, próximo, se espera culminar traslado a campo definitivo (14 hectáreas).

Fertilización de 400 hectáreas de pijuayo para palmito en Tocache, la asistencia técnica se orientó a la supervisión de las labores de deshierbo en 322.90 hectáreas,

Labores de cosecha en la comunidad de San Francisco en Uchiza, crece expectativa de aumento de precio de la chonta en campo

labor que se tornó muy laboriosa debido a la alta incidencia de las malezas, principalmente identificadas en 64.6 hectáreas.

En el marco del Resultado 1.3 del Proyecto Tocache IV Etapa, APROSAN adquirió 150 TM de fertilizantes, tales como, roca fosfórica, dolomita, guano de isla, urea, cloururo de potasio y sulpomag, UNODC coordina con APROSAN Y ASLUSA para la distribución a los productores. Se cuenta con un padrón de 189 productores seleccionados que conducen 400 hectáreas de pijuayo que están en fase de producción. De los productores seleccionados 54 participaron en la III Fase del Proyecto con 190.2 hectáreas de pijuayo en producción.

Cabe indicar que la contribución del Proyecto en la fertilización de plantaciones de pijuayo en Tocache tendrá una incidencia del 53%, con la capitalización del aporte de UNODC, se espera atender al resto (350 ha) de las plantaciones.

Promoción del cacao fino aromático (CFA) en Tocache, en Marzo se continuó con asistencia a los técnicos del Consorcio Cacao Fino Aromático (CAT, ASPROC-NBT, CP CACAO y APCU) para la identificación de clones finos aromáticos promisorios en la provincia de Tocache.

Labores de capacitación a productores de pijuayo en fertilización previo a la distribución de fertilizantes por APROSAN

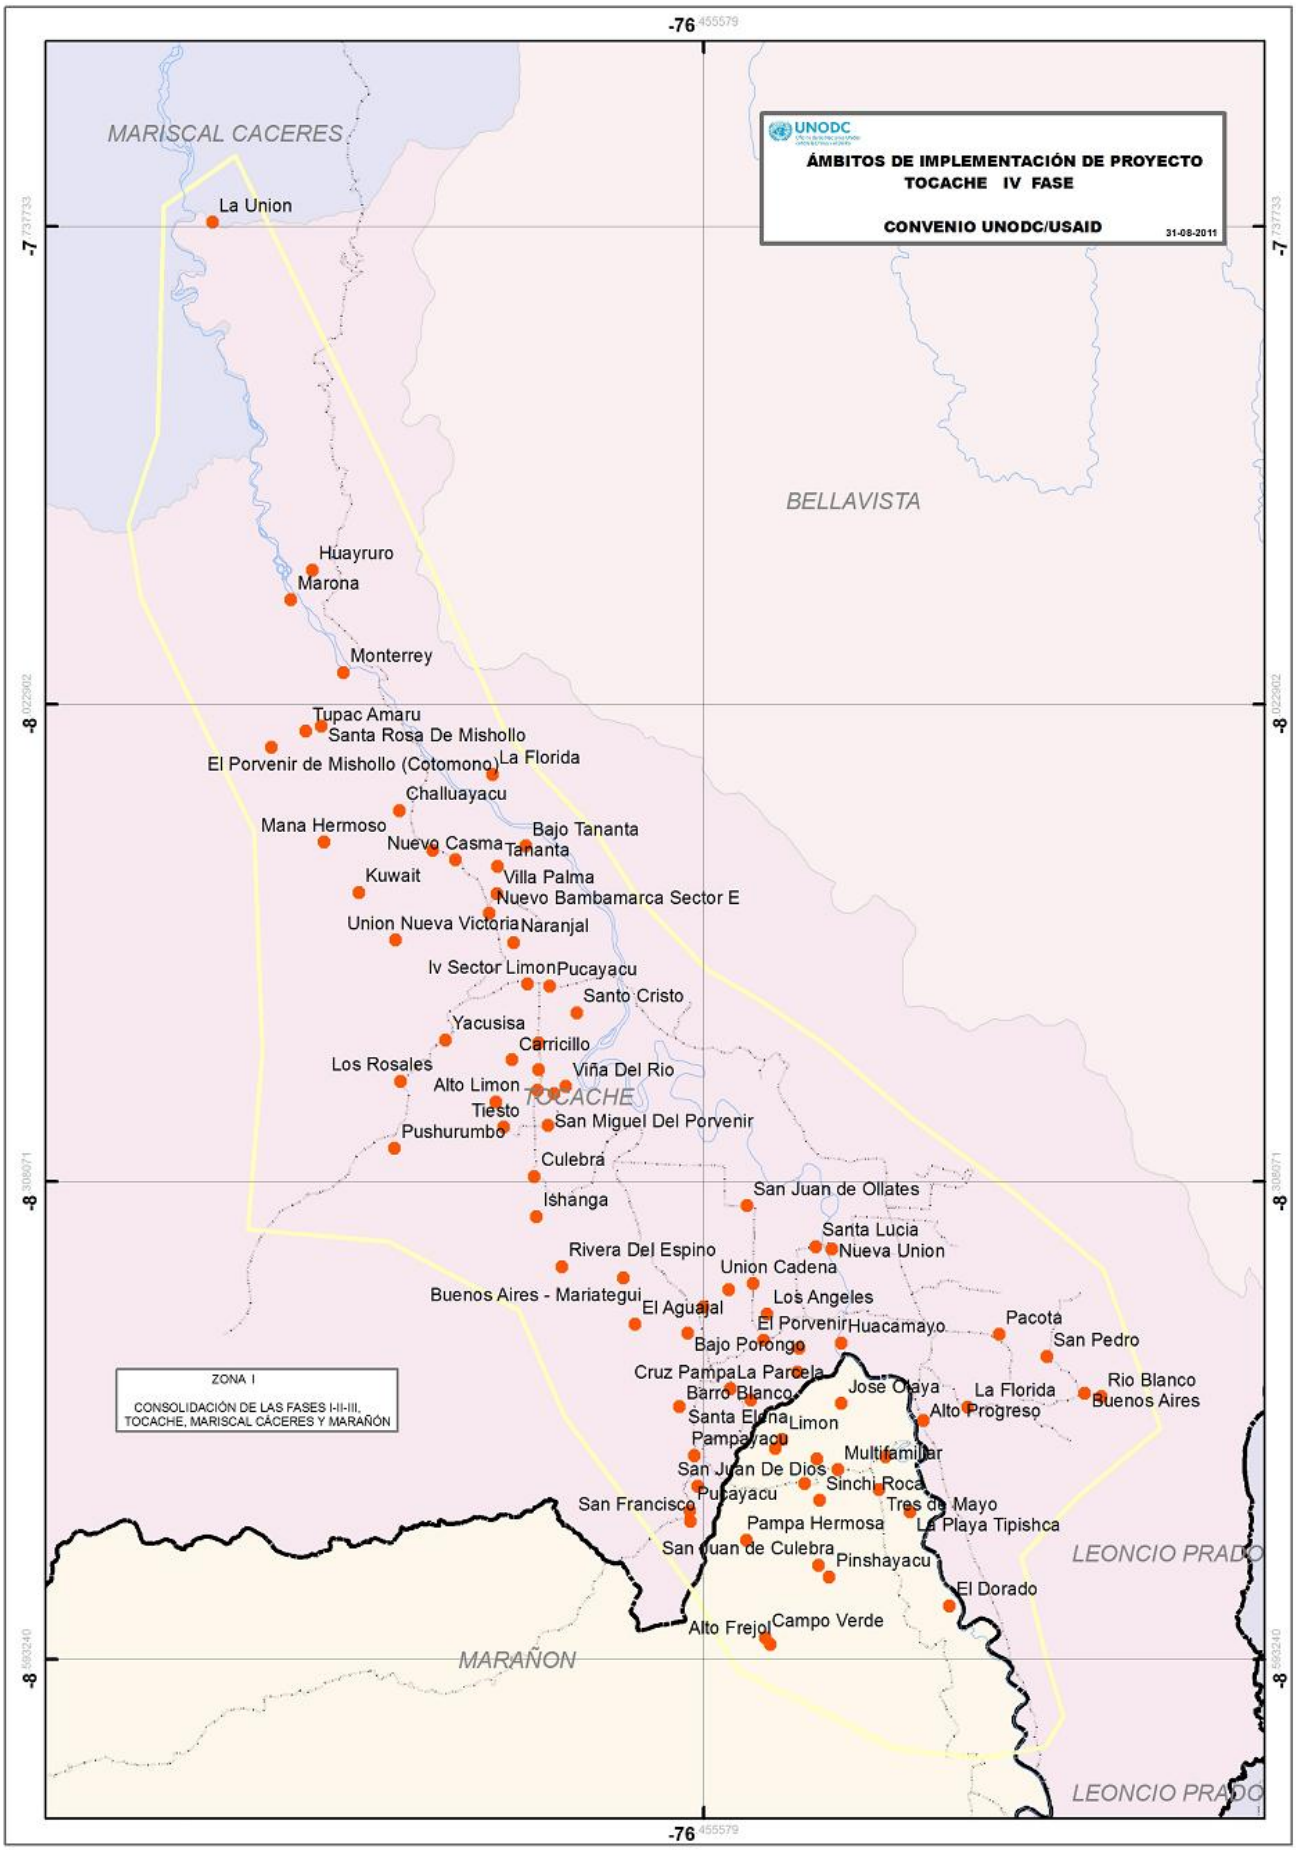
UNODC
ÁMBITOS DE IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTO
TOCACHE IV FASE
CONVENIO UNODC/USAID
31-08-2011
ZONA I
CONSOLIDACIÓN DE LAS FASES I-II-III,
TOCACHE, MARISCAL CÁCERES Y MARAÑÓN
MARISCAL CACERES
BELLAVISTA
TOCACHE
MARAÑON
LEONCIO PRADO
LEONCIO PRADO
La Union
Huayruro
Marona
Monterrey
Tupac Amaru
Santa Rosa De Mishollo
El Porvenir de Mishollo (Cotomono)
La Florida
Challuayacu
Mana Hermoso
Nuevo Casma
Bajo Tananta
Tananta
Kuwait
Villa Palma
Nuevo Bambamarca Sector E
Union Nueva Victoria
Naranjal
Iv Sector Limon
Pucayacu
Santo Cristo
Yacusisa
Carricillo
Los Rosales
Viña Del Rio
Alto Limon
Tiesto
San Miguel Del Porvenir
Pushurumbo
Culebra
Ishanga
San Juan de Ollates
Santa Lucia
Nueva Union
Rivera Del Espino
Union Cadena
Buenos Aires - Mariategui
Los Angeles
El Aguajal
El Porvenir
Huacamayo
Pacota
San Pedro
Bajo Porongo
Cruz Pampa
La Parcela
Barro Blanco
Jose Olaya
La Florida
Rio Blanco
Buenos Aires
Santa Elena
Limon
Alto Progreso
Pampayacu
Multifamiliar
San Juan De Dios
Sinchi Roca
Pucayacu
San Francisco
Tres de Mayo
Pampa Hermosa
La Playa Tipishca
San Juan de Culebra
Pinshayacu
El Dorado
Alto Frejol
Campo Verde
-76.455579
-7.737723
-8.022902
-8.308071
-8.593240

ZONA 02: POST ERRADICACIÓN DE CULTIVOS DE COCA EN BOLSÓN DE CUCHARA, PROVINCIA DE LEONCIO PARADO

En Marzo, periodista de medios locales, y nacionales como, El Comercio, La República, Caretas, ATV, Tv Perú, Panamericana Televisión, Correo Semanal, visitan la comunidad de Venenillo con la finalidad ver ***in situ*** los avances de las acciones del Desarrollo Alternativo, que con apoyo de los agricultores, autoridades locales y regionales, contribuye a crear una base productiva legal, basado en la expansión de los cultivos de café para el mercado orgánico de "calidad" y cacao para mercado del cacao "fino aromático".

Cabe destacar que la comunidad de Venenillo es una de las más representativas del Bolsón de Cuchara, que tiene sus origen en la década de los 80 producto de las migraciones generado por el estímulo de la Carretera Marginal, hoy Fernando Belaunde Terry, y el supuesto apoyo del Estado.

En Venenillo, así como en otras del Alto Huallaga, desde la década del 80 hasta inicios de la década del 90, imperó la violencia social provocada por el narcotráfico, Sendero Luminoso (SL) y el Estado, que en medio de una economía de burbuja en base a los cultivos de coca para la elaboración de droga, trajo consigo, pobreza, aislamiento, corrupción, atentados contra los derechos elementales de las población, como el derecho a la vida, el derecho al libre tránsito en el territorio nacional, derecho a defensa, etc.

Con la erradicación de los cultivos de coca y la firma del Acta de Entendimiento, Venenillo y otras 20 comunidades se abren al mundo con alternativas sostenibles, con 800 hectáreas de cacao y 300 de café, y sobre todo, conocimiento y manejo de los cultivos con mercado asegurado.

Después de 1994, medios de prensa en Venenillo, constaron que los agricultores dejaron la coca para dedicarse a cultivos alternativos como el café

Transcurrido casi un año de presencia del Proyecto Tocache IV Etapa en Bolsón de Cuchara, familias en comunidades circundantes que no formaron parte de la erradicación de cultivos de coca, solicitan la ampliación del Proyecto, como medio para superar la exclusión social y la incertidumbre y caos que aún es generada por el narcotráfico, que aún transita sigilosamente.

ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIA	META GLOBAL PROYECTO (2011-2014)	AVANCE FÍSICO A MARZO 2012	LOGRO ACUMULADO A MARZO 2012 (%)	SEMAFORO
1. Ampliación de la base productiva					
a. Café					
Adquisión de semillas de café	Kg	1,200	Concluido		
Transporte y distribución de semillas	Kg	1,200	0	95%	
Capacitaciones	N° de eventos	36	0	156%	
Instalación y verificación de germinadores	Unidad	300	0	90%	
Repique de plantulas de café	Ha	300	0	84%	
Limpieza y trazado para viveros	Unidad	300	0	84%	
Preparacion de sustrato (desinfección de vivero)	Unidad	300	0	84%	
Llenado de bolsas	Ha	300	0	84%	
Manejo de viveros	Unidad	300	0	84%	
Rozo y limpieza de terreno	Ha	300	0	74%	
Instalación de sombra temporal	Ha	300	0	63%	
Instalación de sombra permanente	Ha	300	0	76%	
Instalación de café en campo definitivo	Ha	300	46	22%	
b. Floricultura					
Compra de hijuelos	Unidad	39,900	0	0%	En cotización
c. Cacao					
Adquisición de semillas	Kg	4,000	0	96%	
Adquisición de hijuelos de plátano	Unidad	500,000	10,000	89%	
Instalacion de tinglado	Unidad	450	Concluido		
Instalacion del vivero	Unidad	450	Concluido		
Llenado de bolsas	Millar	960,000	0	97%	
Producción de plantones	Unidad	960,000	0	96%	
Preparacion de terreno	Ha	800	0	97%	
Siembra sombra temporal	Ha	800	16	89%	
Siembra sombra definitivo	Ha	800	25	55%	
Adquisicion de varas	Unidad	355,520	17,940	11%	
Injertado	Ha	800	15	13%	
Número de capacitaciones	N° de eventos	36	4	208%	
Instalación de cacao en campo definitivo	Ha	800	79	49%	
d. Reforestación					
Construcción de vivero	Unidad	2	0	100%	
Preparacion de sustrato	M^3	800	50	22%	
Llenado de bolsas	Unidad	400,000	25,146	19%	
Capacitación	Evento	16	0	25%	
Adquisión de semillas forestales	Kg	400	0	1%	
Repique de plantulas	Ha	400,000	27,325	12%	
2. Apoyo Municipalidad Castillo Grande					
Elaboración de Plan de desarrollo comunal-Municipalidad del Centro Poblado Castillo Grande	Nº de plan	1	0	0%	
2.1 Infraestuctura vial para Bolsón de Cuchara					
Expediente técnico de rehabilitación de la carretera Castillo Grande - Venenillo	Nº Expediente	1	1	100%	
Rehabilitación de la carretera Castillo Grande - Venenillo	Km	40	5	13%	

Instalación de 300 hectáreas de café, el equipo técnico continuó con la supervisión de las siguientes labores agronómicas:

- Instalación de plantones de café en campo definitivo en 46 hectáreas, haciendo un acumulado de 66

hectáreas, extensión que registra un avance del 22% con respecto a la meta esperada (300 ha).

- Distribución de 1,395 sacos de ecomaster (fertilizante orgánico), que equivale a 69.75 toneladas, en 12 comunidades; cantidad que alcanza para abonar 186 hectáreas de café a razón de 7.5 sacos/Ha.

Instalación de 800 hectáreas de cacao, el equipo técnico supervisó las siguientes labores agronómicas:

- Instalación de sombra temporal (plátano) en 16 hectáreas, el acumulado a Marzo fue 712 hectáreas.
- Instalación de plantones de cacao en campo definitivo en 79 hectáreas, el acumulado fue 393.5 hectáreas, que representa un avance de 49.2% con respecto a lo esperado (800 ha).
- Injerto en patrones de cacao en campo definitivo en 15 hectáreas, el acumulado desde Diciembre fue 100 hectáreas, 12.5% de avance con respecto a lo programado (800 hectáreas).
- Distribución de 733 sacos de roca fosfórica (fertilizante orgánico), que equivale a 36.65 toneladas, en 19 comunidades; cantidad que alcanza para abonar 733 hectáreas de cacao a razón de 01 saco/Ha.

  Cabe destacar, que la actividad prioritaria para Abril próximo es verificar el porcentaje de prendimiento de los injertos de las 100 primeras hectáreas que estuvo a cargo de la Corporación Agrícola López (CORPAL SAC).

Reforestación, los técnicos supervisaron las siguientes actividades:

- Llenado de sustrato en 25,146 bolsas, acumulando 77,146 bolsas, que representa un avance de 19% con respecto a la meta (400,000 bolsas).
- Repique de 27,325 plántulas de regeneración natural de especies como Bolaina, Capirona y Moena, acumulando 46,825 plántulas, cantidad que representa 12% de avance frente lo programado (400,000 plantones).
- Las plántulas provienen de antiguas plantaciones que UNODC promovió en la zona del Monzón a inicios del 2000. Los sistemas de reforestación que se promoverá en la zona de intervención serán en macizo (250 ha) y protección (60 ha).

En rehabilitación de la infraestructura vial entre Castillo Grande y Venenillo, problemas climáticos adversos como precipitación pluvial intensas, hicieron que las instituciones involucradas (Municipalidad Provincial de Leoncio Prado, UNODC y el Frente de Defensa de los Intereses del Bolsón de Cuchara), tomen la decisión en común acuerdo de paralizar los trabajos hasta el mes de mayo próximo, que se estabiliza el clima.

Se suspendió las labores de rehabilitación vial hasta Mayo próximo en Bolsón de Cuchara

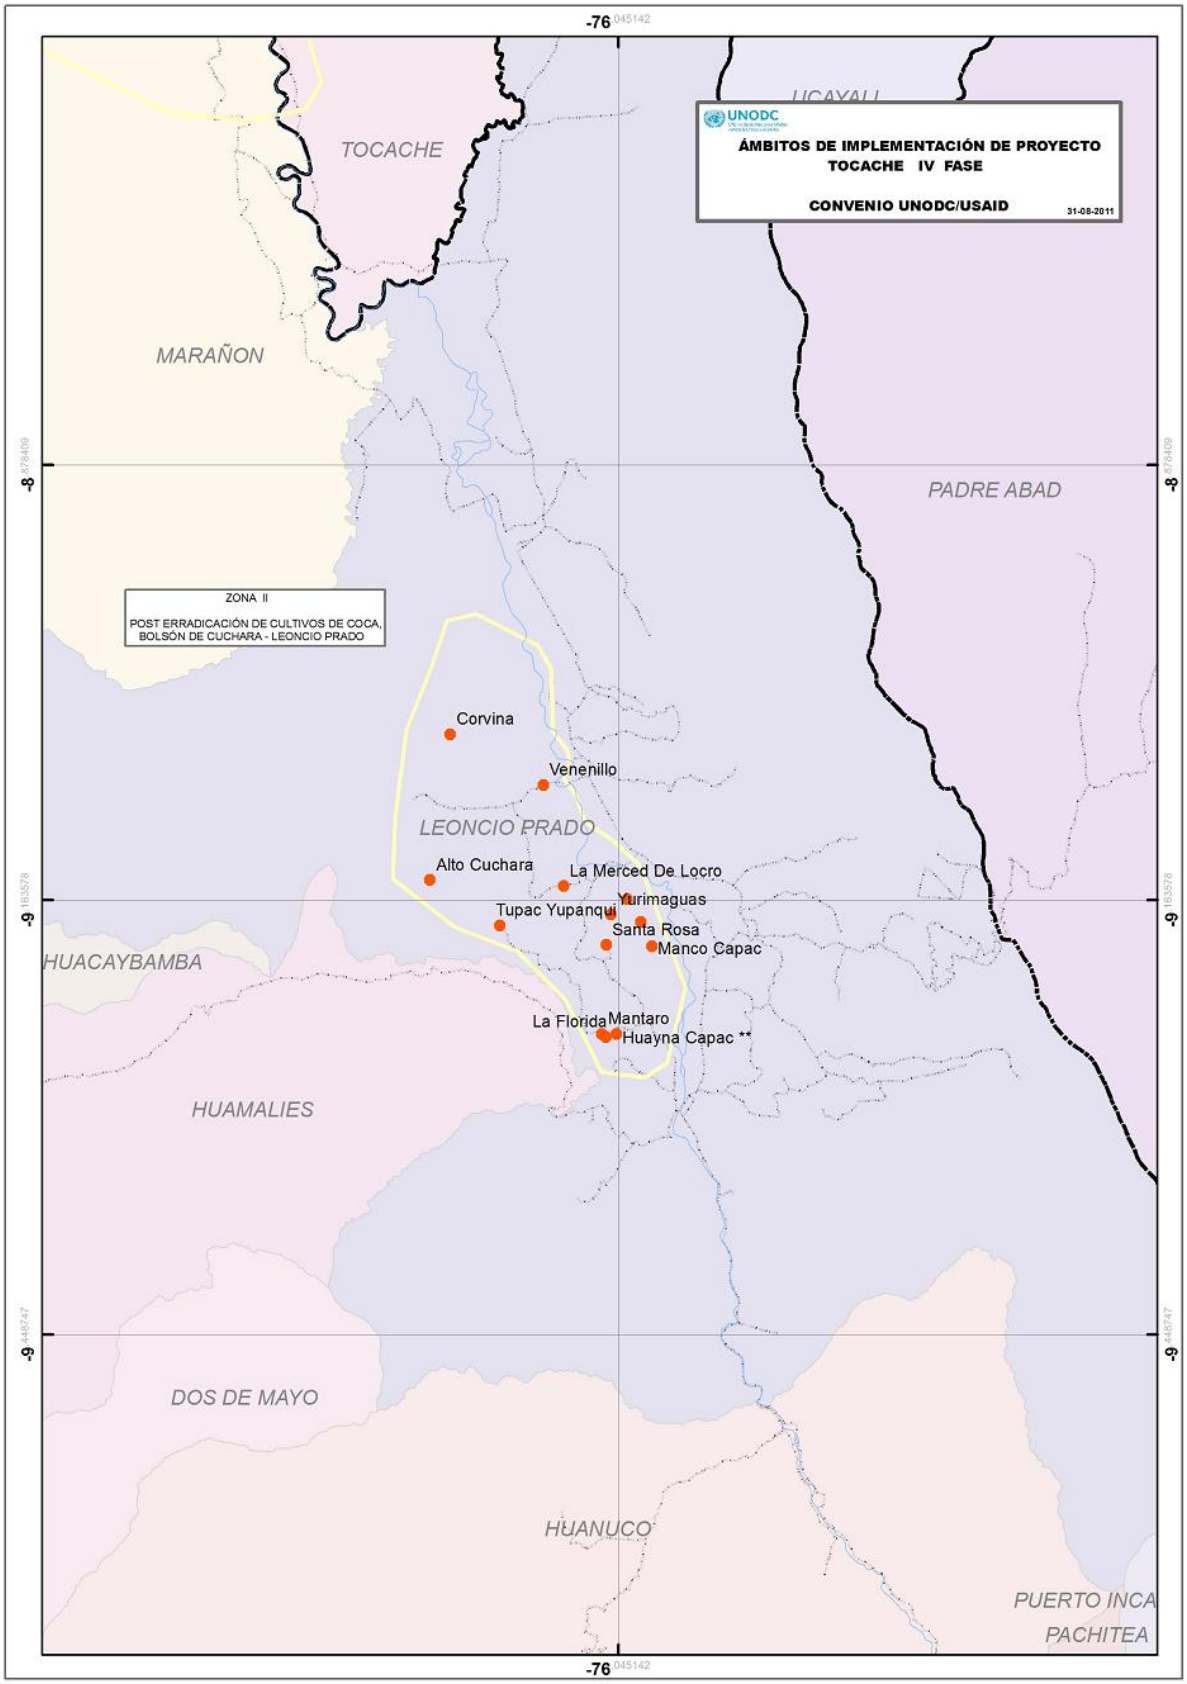
-76 045142
UCAYALI
TOCACHE
UNODC
ÁMBITOS DE IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTO
TOCACHE IV FASE
CONVENIO UNODC/USAID
31-08-2011
MARAÑON
-8 876409
PADRE ABAD
ZONA II
POST ERRADICACIÓN DE CULTIVOS DE COCA,
BOLSÓN DE CUCHARA - LEONCIO PRADO
Corvina
Venenillo
LEONCIO PRADO
Alto Cuchara
La Merced De Locro
Yurimaguas
Tupac Yupanqui
Santa Rosa
Manco Capac
-9 163578
HUACAYBAMBA
La Florida
Mantaro
Huayna Capac **
HUAMALIES
-9 446747
DOS DE MAYO
HUANUCO
PUERTO INCA
PACHITEA
-76 045142

ZONA 03: CONSOLIDACIÓN DE LA PALMA ACEITERA EN SHAMBILLO, PROVINCIA DE PADRE ABAD

En Marzo, en la zona de influencia del Proyecto la situación sociopolítica se mantuvo estable, los niveles de precipitación fueron menores con respecto a los dos primeros meses del año, esto favoreció el normal desarrollo de las labores agrícolas en campo.

Ampliación de 400 hectáreas de palma aceitera (fase vivero), entre las principales actividades realizadas se destacan:

- Mantenimiento de los plantones en el vivero N° 01, localizado en el sector de Mediación, que consistió en deshierbo manual en las bolsas con plantones, y en las calles entre plantones, control fitosanitario con dos aplicaciones de insecticidas y fungicidas por la presencia de insectos.
- El equipo técnico bajo la supervisión de SENASA Ucayali, realizó una segunda selección de plántulas con problemas de raquitismo, que dificulta su normal desarrollo. ***Al cierre de mes se contabilizó 66,757 plántulas emergidas***, 9.5% (711 plántulas) menos que en Febrero.

Asistencia técnica en 2,060.83 hectáreas de palma aceitera,

En Marzo, ASPASH concluyó el levantamiento de los croquis parcelarios de sus socios, los resultados indican que en Shambillo existen 2,124.83 hectáreas destinados a la palma aceitera, de los cuales, 64 hectáreas están abandonadas, el directorio de ASPASH evalúa la recuperación de dichas parcelas. Para fines de seguimiento se mantiene 2,060.83 hectáreas.

En 2011, el balance de las actividades económicas para OLPASA fueron positivas, en Abril próximo se iniciará el reparto de utilidades a sus socios.

Entre las principales actividades supervisadas por el equipo técnico se destacan:

- Plateo manual de plantones en 260 hectáreas, en términos acumulados llegó a 735 hectáreas, 35.6% de avance con respecto al total de áreas en producción y en crecimiento (2,060.83 hectáreas).
- Plateo químico en 355 hectáreas, que acumulado sumó 1,014 hectáreas, 49.2% de avance.
- Limpieza de interlíneas en 444 hectáreas, que acumulado sumó 1,286 hectáreas, 62.4% de avance..
- Podas sanitarias en 338 hectáreas, que acumulado sumó 726 hectáreas.
- Labores de fitosanidad por problemas de marchitez sorpresiva en 59 plantas, que acumulado sumó 239 plantas. Esta situación se atribuye, principalmente por falta de manejo continuo de las plantaciones por los propios productores. Para mitigar este problema, el equipo técnico planifica la ejecución de un plan de capacitaciones en coordinación con ASPASH.

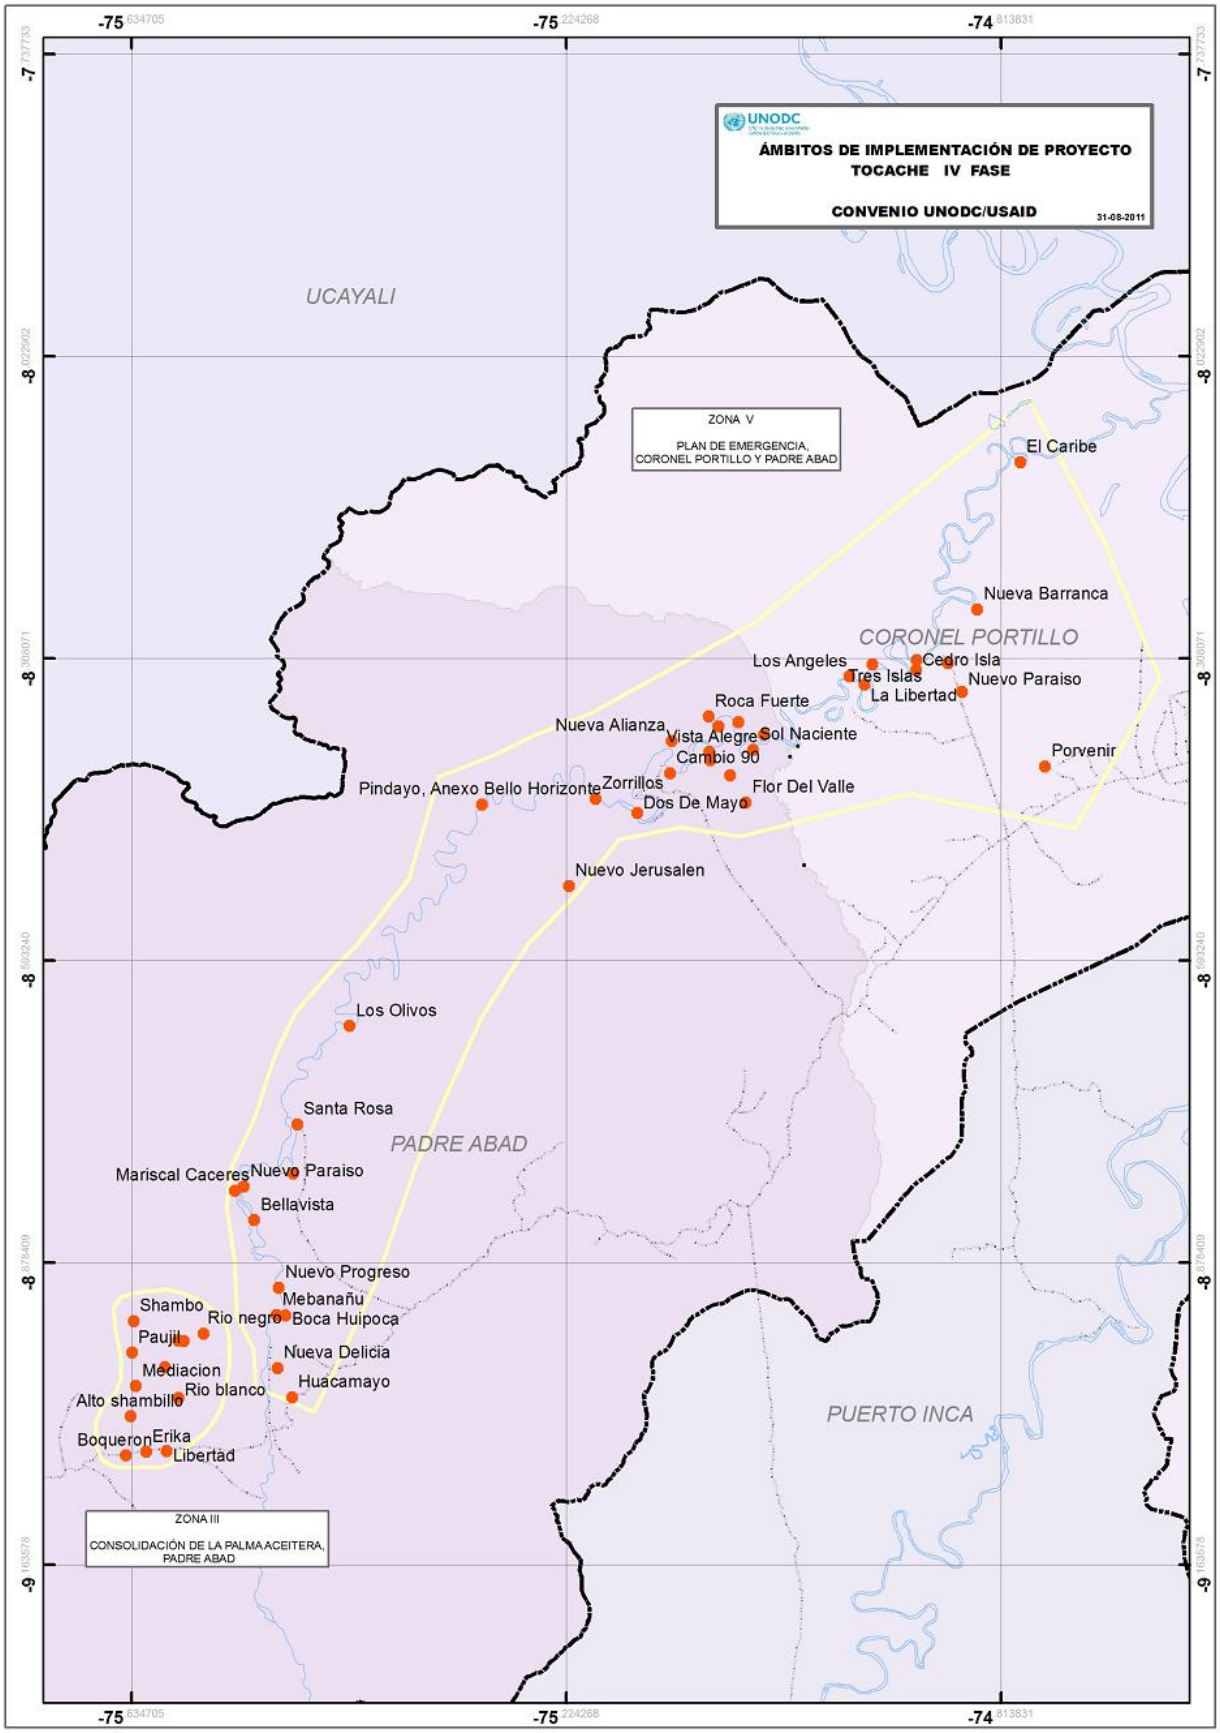
UNODC
ÁMBITOS DE IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTO
TOCACHE IV FASE
CONVENIO UNODC/USAID
31-08-2011
UCAYALI
ZONA V
PLAN DE EMERGENCIA,
CORONEL PORTILLO Y PADRE ABAD
CORONEL PORTILLO
PADRE ABAD
PUERTO INCA
ZONA III
CONSOLIDACIÓN DE LA PALMA ACEITERA,
PADRE ABAD
El Caribe
Nueva Barranca
Los Angeles
Cedro Isla
Tres Islas
Nuevo Paraiso
La Libertad
Roca Fuerte
Nueva Alianza
Vista Alegre
Sol Naciente
Cambio 90
Porvenir
Pindayo, Anexo Bello Horizonte
Zorrillos
Flor Del Valle
Dos De Mayo
Nuevo Jerusalen
Los Olivos
Santa Rosa
Mariscal Caceres
Nuevo Paraiso
Bellavista
Nuevo Progreso
Mebanañu
Shambo
Rio negro
Boca Huipoca
Paujil
Nueva Delicia
Mediacion
Huacamayo
Rio blanco
Alto shambillo
Boqueron
Erika
Libertad
-75.634705
-75.224268
-74.813831
-7.737733
-8.122902
-8.308071
-8.493240
-8.678409
-9.163578

ZONA 04: CONSOLIDACIÓN DE LA PALMA ACEITERA EN PONGO DE CAYNARACHI Y YURIMAGUAS, PROVINCIAS DE LAMAS Y ALTO AMAZONAS

En Marzo, las condiciones climáticas se mostraron irregulares con precipitaciones prolongadas, que dificultaron las labores agronómicas. Asimismo, afectaron algunas las vías de acceso, como por ejemplo entre Pongo y Barranquita, que dificultó el acopio de racimos.

Labores agronómicas en vivero para 700 hectáreas, el equipo técnico en estrecha coordinación con los 140 familias seleccionadas para la ampliación de palma aceitera realizaron las siguientes labores:

- Control permanente de maleza en las bolsas y en las calles, en forma manual y aplicación de agroquímicos (Bazuka, dosis 2 Lt./cilindro de agua).
- Labores de riego en días de baja precipitación para mantener la humedad del sustrato.
- Tratamiento fitosanitario con aplicación de productos químicos como Servín y dithane. Asimismo, para garantizar el buen desarrollo de los follajes se aplicó a los plantones urea diluida al 5%.
- Aplicación de la primera dosis de la primera dosis de fertilización solida con urea, fosfato diamónico y cloruro de potasio (mezcla, 5 gr. por planta).
- Labores de distanciamiento de los plantones (0.70 cm x 0.70 cm) para garantizar el buen desarrollo.

Cabe destacar, que el ***stock de plantones en vivero localizado en San Miguel de Achanamiza fue el mismo reportado en Febrero (122,283).***

Asistencia técnica a socios de JARPAL (2,080.01 ha), el equipo técnico supervisó las siguientes labores agronómicas:

- Supervisión de las labores de mantenimiento de círculo, interlíneas, podas, mantenimiento de drenaje y coberturas en el 57% de las áreas con palma en producción (421.30 ha) que beneficiaron a 191 productores de un total de 285.
- Supervisión de las labores de mantenimiento de círculos, interlíneas, drenajes y cobertura en 87% de las áreas en crecimiento instaladas en 2010 (188.5 ha), que benefició a 64 productores de un total de 74.
- Supervisión de las labores de mantenimiento de círculos, interlíneas, cobertura y aplicación de abonos orgánicos en 50% de las áreas en crecimiento instaladas en 2011 (294.96 ha), que benefició a 39 productores de un total de 78.

Control fitosanitario de los plantones en vivero

Labores agronómicas en parcelas de palma en producción en Pongo de Caynarachi

COMITÉ	N° DE BENEF.	Nº BENEF. ATEND.	AREA NETA Has.	AREA ATEND Has.	LABORES CULTURALES (Has)													
					CIRCULO		INTERLIN		PODA		FERTLIZ		MAN-DREN		COBERT.		ABO. ORG.	
					Mes	Acum.	Mes	Acum.	Mes	Acum.	Mes	Acum.	Mes	Acum.	Mes	Acum.	Mes	Acum.
Pongo - Yumbatos	32	22	76.74	51.85	16.29	70.25	16.33	57.19	6.75	20.15	0.00	2.29	0.00	2.29	1.58	67.88	0.00	0.00
Metilluyoc	32	29	74.51	61.22	7.72	50.85	10.81	50.19	0.00	31.00	0.00	34.00	0.00	0.00	5.23	59.52	0.00	0.00
San Miguel de Achinamiza	15	15	31.20	31.20	11.00	26.20	9.00	24.05	4.50	17.10	0.00	4.50	0.00	0.00	29.30	57.10	0.00	0.50
Sangamayoc	22	17	36.04	32.05	9.62	26.68	12.18	23.62	0.00	4.50	0.00	6.24	0.00	0.00	0.95	31.58	0.00	0.00
Nueva Libertad	34	27	66.56	55.18	1.17	19.86	1.34	19.85	0.00	3.90	0.00	19.23	400.00	400.00	1.60	49.28	0.00	0.00
Convento	30	20	73.41	49.72	9.51	55.89	9.51	55.89	9.51	9.51	0.00	4.72	0.00	0.00	0.00	73.41	0.00	0.00
Pintuyaquillo	20	14	47.49	29.24	9.04	38.28	9.04	38.28	9.04	33.56	0.00	18.78	0.00	8.13	0.00	47.49	0.00	0.00
Davicillo	61	30	248.49	74.84	19.30	135.28	19.30	135.28	4.39	120.37	0.00	38.20	0.00	29.34	0.00	248.49	0.00	0.00
Bonilla	39	17	77.50	36.00	24.39	60.81	24.39	60.81	3.71	26.44	0.00	14.74	0.00	6.37	0.00	77.50	0.00	0.00
TOTAL	**285**	**191**	**731.94**	**421.30**	**108.04**	**484.10**	**111.90**	**465.16**	**37.90**	**266.53**	**0.00**	**142.70**	**400.00**	**446.13**	**38.66**	**712.25**	**0.00**	**0.50**

Labores agronómicas en parcelas de palma en crecimiento instaladas en 2010 en Pongo de Caynarachi

COMITÉ	N° DE BENEFI.	Nº BENEF. ATEND.	AREA NETA Has.	AREA ATEND Has.	LABORES CULTURALES (Has)											
					CIRCULO		INTERLIN		FERTLIZ		MAN-DREN		COBERT.		ABO. ORG.	
					Mes	Acum.	Mes	Acum.	Mes	Acum.	Mes	Acum.	Mes	Acum.	Mes	Acum.
Pongo - Yumbatos	4	4	10.41	10.41	2.26	10.21	3.26	10.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	8.90	0.00	0.00
Metilluyoc	17	16	64.95	64.18	6.14	53.36	13.80	41.46	0.00	12.20	0.00	1.00	7.23	56.68	0.00	0.00
San Miguel de Achinamiza	9	9	29.26	29.26	6.97	23.72	6.97	22.10	0.00	1.95	80.00	84.00	5.75	23.98	0.00	0.00
Sangamayoc	8	8	10.13	10.13	2.00	10.09	1.17	8.07	0.00	0.00	400.00	400.00	1.67	11.26	0.00	0.00
Nueva Libertad	29	22	70.29	45.79	8.77	32.60	8.77	32.60	0.00	15.00	0.00	0.00	1.16	35.09	0.00	0.00
Davicillo	4	4	3.11	3.11	0.00	3.11	0.00	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.11	0.00	0.00
Bonilla	1	1	0.70	0.70	0.00	0.70	0.00	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00	0.70	0.00	0.00
TOTAL	**72**	**64**	**188.85**	**163.58**	**26.14**	**133.79**	**33.97**	**118.25**	**0.00**	**29.85**	**480.00**	**485.00**	**16.01**	**139.72**	**0.00**	**0.00**

Labores agronómicas en parcelas de palma en crecimiento instaladas en 2011 en Pongo de Caynarachi

COMITÉ	N° DE BENEFI.	Nº BENEF. ATEND.	AREA NETA Has.	AREA ATEND Has.	LABORES CULTURALES (Has)											
					CIRCULO		INTERLIN		FERTLIZ		MAN-DREN		COBERT.		ABO. ORG.	
					Mes	Acum.	Mes	Acum.	Mes	Acum.	Mes	Acum.	Mes	Acum.	Mes	Acum.
Pongo - Yumbatos	9	7	35.19	28.19	8.70	20.19	8.70	20.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	2.50	0.00	0.00
Metilluyoc	11	8	35.49	20.49	3.60	4.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10	10.60	0.00	0.00
San Miguel de Achinamiza	1	1	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nueva Libertad	1	1	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
Convento	9	2	52.64	17.00	7.00	24.00	7.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pintuyaquillo	11	5	36.53	16.82	6.52	23.34	6.52	23.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Davicillo	26	9	83.36	27.80	6.78	49.85	6.78	49.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00
Bonilla	10	6	41.76	27.55	14.00	32.35	14.00	32.35	0.00	18.35	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
TOTAL	**78**	**39**	**294.96**	**147.84**	**49.60**	**157.33**	**49.60**	**156.33**	**0.00**	**18.35**	**0.00**	**0.00**	**2.60**	**18.10**	**1.00**	**1.00**

- En sanidad vegetal de las plantaciones de palma, se identificaron y eliminaron 137 plantas con problema de marchitez sorpresiva, 26 plantas con problema de anillo illo rojo, 10 plantas atacadas con pudrición severa de flecha y 2 plantas con pudrición de bulbos. Estos problemas afectaron a 43 productores en el Pongo de Caynarachi.

- Cabe destacar en Marzo, el equipo técnico contribuyó en la supervisión del vivero para 600 hectáreas de palma que JARPAL, se evidenció luego de 45 días de siembra, se evidenció 94.5% de emergencia de plántulas.

Sanidad vegetal en plantaciones de palma aceitera en el Pongo de Caynarachi

COMITÉ	N° DE PALMICULTORES AFECTADOS	N° PLANTAS ENFERMAS ERRADICADAS							
		Marchitez Sorpresiva		Anillo Rojo		Pudricion Severa de Flecha		Pudricion de bulbo	
		Mes	Acum	Mes	Acum	Mes	Acum	Mes	Acum
Pongo - Yumbatos	12		22		5		14		
Metilluyoc	4	12	12	4	4				
San Miguel de Achinamiza	3	3	3	5	5				
Sangamayoc	3	10	10	1	1				
Nueva Libertad	21	69	69	12	12	3	3	2	2
Convento	12		19		6		23		
Pintuyaquillo	3		3		0		8		
Davicillo	34		2		17		104		
Bonilla	15		7		5		42		
Pampa Hermosa	7	18	18	3	3	4	4		
Miguel Grau	4	9	9	1	1	3	3		
San Juan de Pamplona									
Santo Tomas									
Mariano Melgar									
Bajo Shanusi	3	16	16						
TOTAL	**43**	**137**	**190**	**26**	**59**	**10**	**201**	**2**	**2**

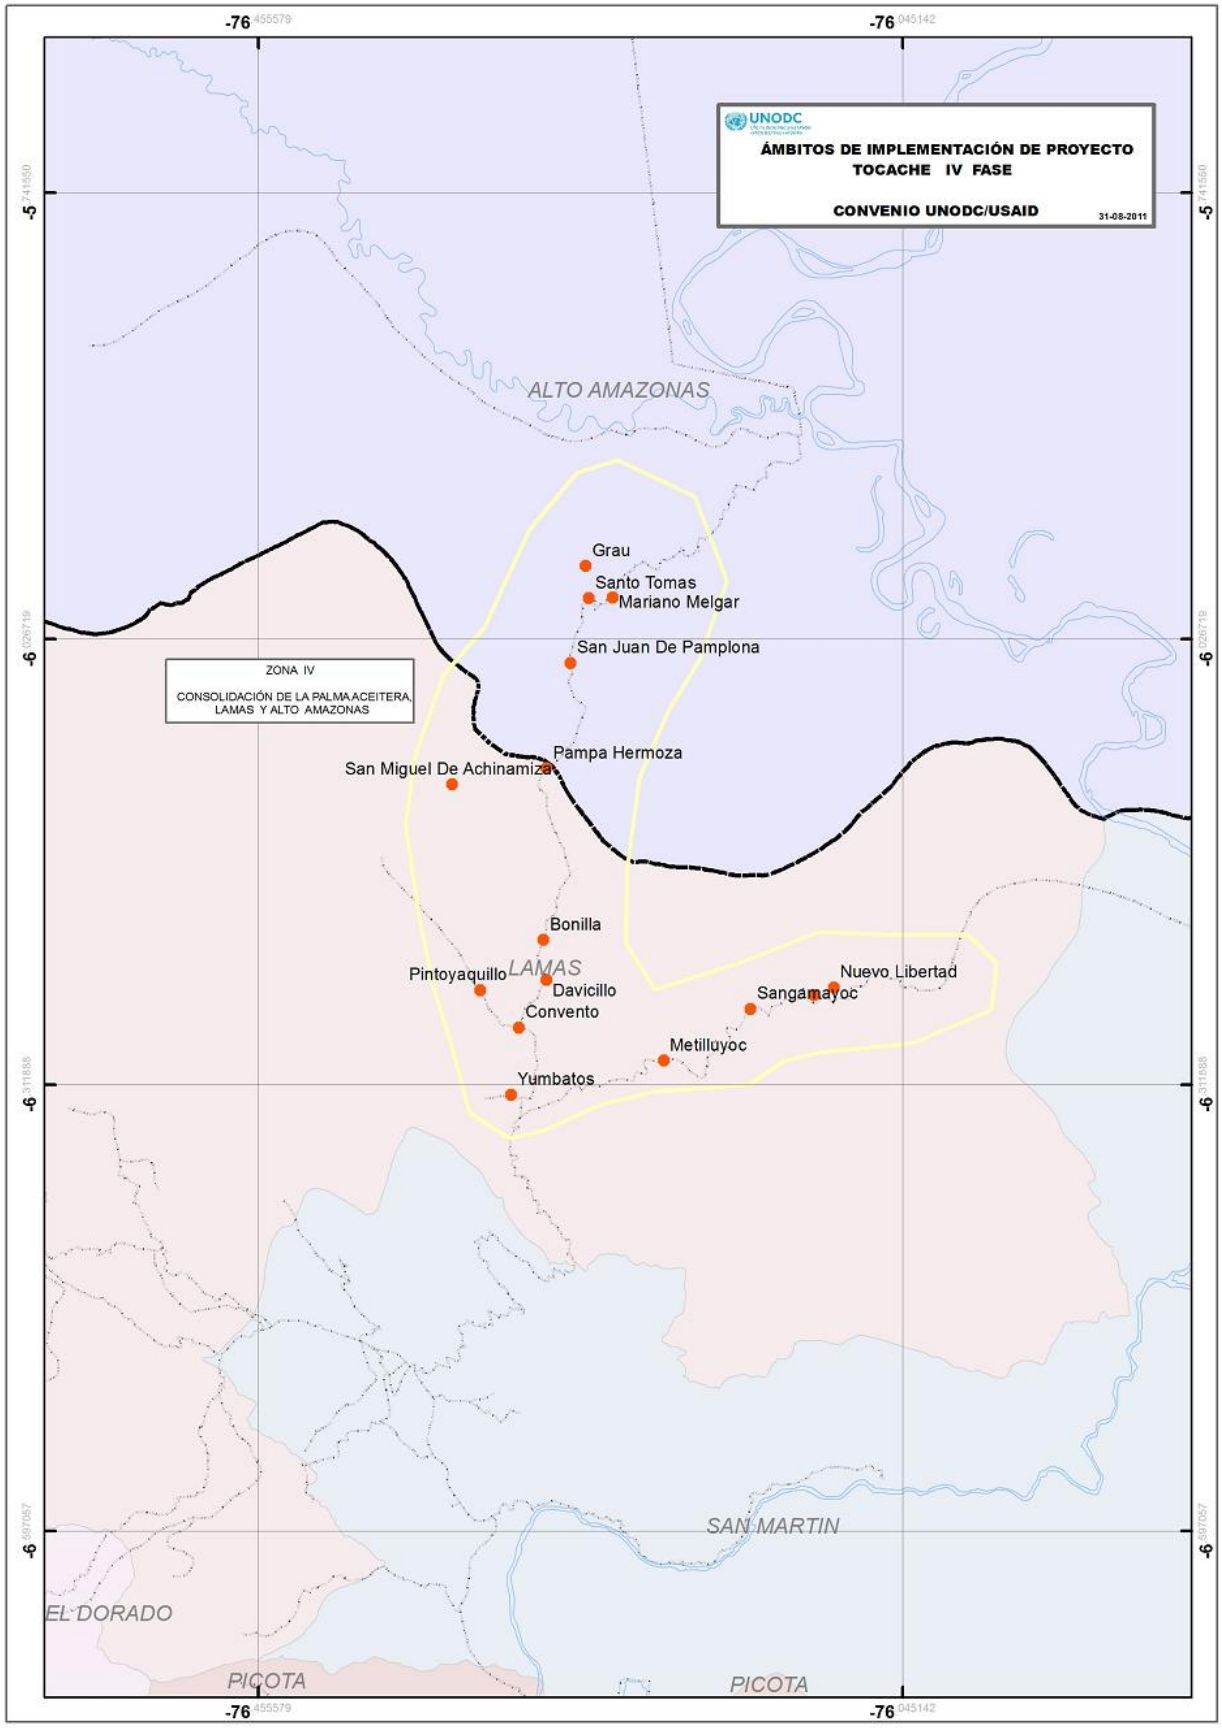
UNODC
ÁMBITOS DE IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTO
TOCACHE IV FASE
CONVENIO UNODC/USAID
31-08-2011
ZONA IV
CONSOLIDACIÓN DE LA PALMA ACEITERA,
LAMAS Y ALTO AMAZONAS
-76.455579
-76.045142
-5.741580
-6.026719
-6.311858
-6.597087
ALTO AMAZONAS
Grau
Santo Tomas
Mariano Melgar
San Juan De Pamplona
Pampa Hermoza
San Miguel De Achinamiza
Bonilla
LAMAS
Pintoyaquillo
Davicillo
Convento
Nuevo Libertad
Sangamayoc
Metilluyoc
Yumbatos
SAN MARTIN
EL DORADO
PICOTA
PICOTA

ZONA 05: PLAN DE EMERGENCIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO Y PADRE ABAD

En Marzo, se concluyó el estudio de Vulnerabilidad y Riesgos para la Región Ucayali, que amplía la metodología de trabajo en campo (encuestas estructuradas) y entrevistas, diagnóstico meteorológico de las estaciones localizadas en la región, caracterización de los niveles de precipitación y temperaturas, entre otros aspectos.

La presentación del informe final está prevista para Abril, que mostrará con mayor detalle la dinámica, incidencia, causalidad y la naturaleza de los factores causantes de los diversos peligros (naturales o entrópicos) sobre poblaciones y áreas vulnerables que desencadenan en escenarios de riesgos que ponen en peligro la seguridad alimentaria de los habitantes de la región.

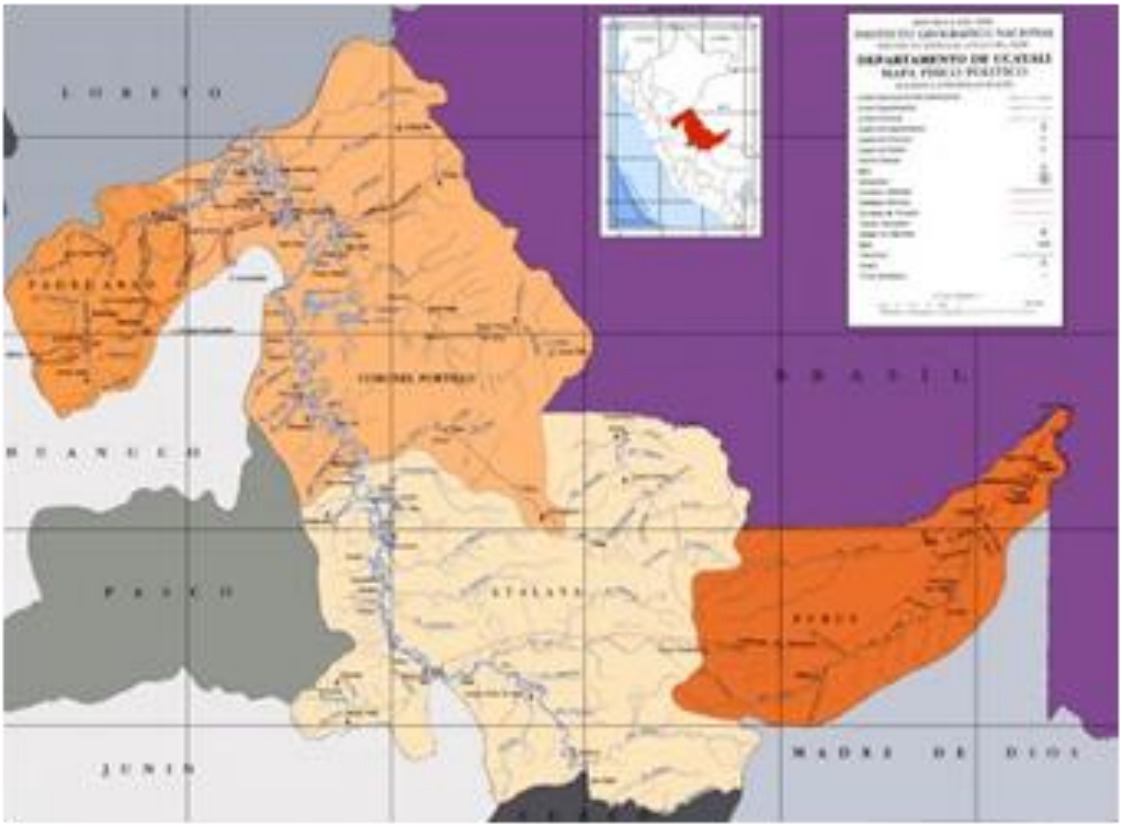

En Abril, la Región Ucayali contará con informe de Vulnerabilidad y Riesgos para el sector agropecuario

FORTALECIMIENTO DEL SECTOR PALMICULTOR

De acuerdo las actividades previstas en el Resultado 2 del Proyecto, en Marzo se realizaron las siguientes actividades:

ENTIDAD FINANCIERA

- Se cuenta con propuesta de servicios para la preparación de un Estudio de Factibilidad Económico Financiero para Constituir una Caja Rural de Ahorro y Crédito (CRAC) que contará con reconocimiento y apoyo de las Asociaciones y Empresas de pequeños y medianos productores vinculadas a la palma aceitera.
- Como parte del servicio, se generarán acciones primarias para promover el interés inicial de potenciales accionistas que complementen el accionariado constituido por las Asociaciones y Empresas vinculadas a la palma aceitera, café , cacao, entre otros. Estos deben disponer de amplia experiencia en el ambiente de gestión crediticia, sólido respaldo financiero, importante presencia a nivel internacional (organismos multilaterales) y probada de solvencia ética y moral.
- El estudio de factibilidad mostrará el nivel de entendimiento entre los accionistas que, de ejecutarse el proyecto, dispondrán de una entidad financiera para diversificar la naturaleza sectorial de sus inversiones en la región.
- Asimismo, contar con un instrumento que mejore su capacidad de negociación crediticia al interior del sistema financiero formal de la región, y en el marco regulatorio vigente, complementar sus requerimientos crediticios de acuerdo a Ley.

PALMA SOSTENIBLE (RSPO)

- Oleaginosa Peruana S.A. (OLPESA), como entidad que representa al sector palmero del Perú fue inscrito ente la Roundtable for Sustainable Pal Oil -RSPO para su reconocimiento y aprobación para iniciar las gestiones que conlleven a la Interpretación Nacional (IN) de los Principios y Criterios de la RSPO. Cabe destacar, que el 08 de Febrero de 2012 OLPESA fue elegido como "entidad líder" del sector palmero con aprobación de los representantes de las organizaciones de productores de palma aceitera (Federación Nacional de Palmicultores del Perú -FENAPALMA-, Confederación Nacional de Palmicultores y Empresas de Palma Aceitera del Perú -CONAPALMA, JARPAL, ACEPAT, ASPASH y COCEPU), Ministerio de Agricultura, Palmas del Espino S.A., PNUD, empresas de pequeños y medianos productores de palma (OLPESA, OLPASA, INDUPALSA y OLAMSA).
- Entre el 27 y 30 de Marzo, se llevó a cabo la III Conferencia Latinoamericana de la RSPO en Quito Ecuador, en el evento participaron más de 3000 personas vinculadas al sector palmero de la región

y representantes del sector palmero de Malasia, UNODC participó como asistente en el evento. Entre los principales temas tratados se destacan: Análisis de oferta y demanda de aceite de palma sostenible y expectativas de crecimiento del mercado, procedimiento para el desarrollo de nuevas plantaciones para la producción de biodiesel, consideraciones sociales abordados por la RSPO, incremento de áreas certificadas de palma aceitera por la RSPO, innovación tecnológica para aprovechamiento de las biomasas para la producción de energía renovable, producción de compostaje, reducción de gases de efecto invernadero y calificación como proyectos MDL y mejores prácticas agrícolas en la palma aceitera para garantizar la sostenibilidad del sector, etc.

- En Quito se revisó el plan de trabajo con consultor de Colombia, que actuará como facilitador, para iniciar las gestiones para la IN de la RSPO en Perú.
- En Quito se estableció reuniones con representantes de FEDEPALMA de Colombia, ANCUPA de Ecuador, Grupo Agropalma de Brasil, para recoger las experiencias en torno al desarrollo de la IN en Colombia y Ecuador y la certificación RSPO en Brasil.
- En la última semana de Marzo, Control Unión Perú presentó a Oleaginosa Padre Abad S.A su programa de trabajo para la aplicación de la auditoria bajo el standard Fair Choice, que debe iniciarse el 16 de Abril próximo.

Jean Mesa, Presidente Ejecutivo de FEDEPALMA en Colombia expone las perspectivas de la palma sostenible en Latinoamérica.

CAPITAL SOCIAL

Entre las principales actividades realizadas en Febrero, se destacan:

- Contratación del personal que implementará el Plan de Trabajo del Capital Social basado en la promoción del deporte mediante el establecimiento de escuelas de futbol en las zonas de incidencia de la palma aceitera como Neshuya, Aguaytía, Tocache y Pongo de Caynarachi. El equipo está compuesto por 4 coordinadores zonales, un coordinador general con sede en Tocache y 5 promotores sociales.
- En Abril próximo se culminará la contratación de los 3 promotores sociales restante.
- Cabe destacar que en Febrero UNODC suscribió convenios en el marco del Proyecto Tocache IV Etapa con las 04 organizaciones de productores de palma (COCEPU-OLAMSA, ASPASH-OLPESA, JARPAL-INDUPALSA y ACEPAT-OLPESA) para promover el crecimiento del capital social mediante la conformación de escuelas de fútbol y promoción de competencias deportivas.

Resultado 2.5 del Proyecto en marcha con la firma de convenios con las organizaciones de productores de palma y contratación del equipo técnico

COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN DEL DESARROLLO ALTERNATIVO

En el Marco del Resultado 5 del Proyecto Tocache IV Etapa, el Área de Comunicaciones Advocay y Estudios, en Marzo realizó las siguientes acciones:

- Cobertura de principales medios periodísticos regional y nacional realizado entre el 01 y 04 de Marzo en las localidades de Santa Rosa de Mishollo, Provincia de Tocache, Región San Martín; Paraíso, Provincia de Marañon y Bolsón Cuchara, Provincia de Leoncio Prado, Región Huánuco, con la finalidad de mostrar los avances del Proyecto Tocache IV Etapa en la otrora zona de mayor conflictividad social del Alto Huallaga.

- Los diversos medios de prensa difundieron noticias y reportajes que destacaron la labor que realiza la Cooperación Internacional en su contribución al Estado en lucha contra la reducción de la oferta de drogas mediante la implementación de alternativas productivas lícitas y sostenibles[1].

- Está en funcionamiento el Portal del Desarrollo Alternativo[2] espacio especializado en temas que contribuyen a promover y destacar los avances de la lucha contra las drogas en el Perú, próximamente estará en ejecución las cuentas en Twitter y Facebook para masificar aún más la difusión.

- A solicitud del Gobierno Regional de Huánuco, se inició la elaboración de la "Estrategia de articulación intergubernamental de la inversión pública en zonas cocaleras de Huánuco", al respecto se realizaron reuniones de trabajo con representantes de las siguientes entidades:
    - Dirección General de Electrificación Rural
    - SENASA-MINAG
    - Dirección General de Competitividad Agraria – MINAG
    - AGROIDEAS – MINAG
    - Programa Subsectorial
    - Programa Subsectorial de Irrigaciones – MINAG
    - PRONAMA – MINEDU
    - FONCODES – MIDIS
    - JUNTOS – MIDIS
    - PRONAA – MIDIS
    - SIS – MINSA
    - Jóvenes a la Obra – MINTRA
    - Trabaja Perú – MINTRA
    - Provías Descentralizado – MINTC
    - FITEL – MINTC
    - Programa Integral de Mejoramiento de Barrios y Pueblos – MVCS
    - PRONASAR – MVCS
    - CMAN – MINJUS

[1] http://www.larepublica.pe/08-03-2012/venenillo-un-pueblo-que-ahora-siembra-cacao-tras-bombardeo
http://www.tvperu.gob.pe/noticias/nacional/selva/32305-campesinos-del-huallaga-realizan-cultivos-alternativos-.html
http://www.panamericana.pe/buenosdiasperu/nacionales/102751-pueblos-alto-huallaga-reincorporan-sociedad-captura-artemio.
Correo Semana, Cultivos Alternativos en el Alto Huallaga.
El Comercio, El Artemio que abrió la puerta de un nuevo Paraíso.

[2] http://desarrolloalternativo.pe/

- Dirección General de MYPE y Cooperativas – PRODUCE
- OINFE – MINEDU

- Se inició el estudio: “Oferta y Demanda de inversión Pública en zonas cocaleras de Huánuco”.

CRÓNICA

El Artemio que abrió la puerta de un nuevo Paraíso

KATHERINE SUBIRANA ABANTO

No hay Paraíso que aguante a dos Artemios. Artemio Miranda, ex alcalde de la idílica localidad de Paraíso, en el Alto Huallaga, ha perdido la cuenta de las veces en que el ex cabecilla senderista Florindo Eleuterio Flores Hala, 'Artemio', lo amenazó de muerte. El terrorista no aceptaba que el otrora Paraíso de Sendero Luminoso y del narcotráfico le diera la espalda a la coca y abriera la puerta a la producción de cultivos alternativos (cacao y palma aceitera), y menos que quien liderara ese cambio fuera otro Artemio. El bueno.

A pesar de las amenazas, Artemio Miranda fue dos veces alcalde del Paraíso que lo vio nacer. Desde ese puesto atendió el llamado de más de mil familias que pidieron cambiar la coca por los cultivos alternativos de cacao y palma aceitera, y abrió las puertas al Estado y a la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga (Unodc).

Era el 2008. Entonces, Artemio y 'Artemio' se vieron las caras. El terrorista lo amenazó directamente y no se cansaba de enviarle mensajes con sus subalternos, y Sendero retomó la vieja costumbre de pintarrajear paredes para intentar dominar un Paraíso que no le pertenecía.

Pero la decisión estaba tomada: más de mil familias firmaron un acuerdo para empezar a sembrar cacao y palma aceitera con la ayuda de la Unodc. Y Artemio Miranda, como alcalde, respaldó esa decisión.

Más de mil hectáreas de cacao y mil de palma aceitera son para la Unodc garantía de desarrollo alternativo. Por ello, ya apuestan por la construcción de una planta de proceso de palma aceitera para julio de este año.

'Artemio' está ahora en prisión y Artemio Miranda no volvió a postular a la alcaldía, pero la historia de Paraíso se ve marcada por los dos.

De 'Artemio' queda de recuerdo una pinta mal escondida en el frontis del municipio. "Viva SL y el aniversario de la invencible guerra armada", dice. Lo cierto es que, según Artemio Miranda, Sendero y la población habían aprendido a convivir en un acuerdo tácito que pocas veces era roto por alguna de las partes.

La histórica ausencia del Estado en la zona acentuaba el temor en la población: una carretera sin asfaltar, un colegio cuyas aulas se descascaran, la falta de un centro de salud y de una comisaría causan más temor que Sendero mismo.

El perpetuo estado de emergencia del Alto Huallaga corresponde con la sensación de inseguridad que sienten sus pobladores. Artemio Miranda sabe que con 'Artemio' en prisión, Sendero buscará la forma de reorganizarse, y teme que sin una presencia formal de un Estado hasta ahora ficticio, el camino de Paraíso se desvíe hacia el infierno.

NICOLAS ZEBALLOS

EL BUENO. Este Artemio luchó contra 'Artemio' para erradicar la sombra de Sendero y del narcotráfico de Paraíso, un poblado del Alto Huallaga donde el Estado llega poco, mal o nunca.

LA TIERRA ENTRE DOS FRONTERAS

EL TRISTE PARAÍSO

Un lugar marcado por la tristeza

Los fundadores de Paraíso llegaron al Alto Huallaga huyendo de la tristeza y la muerte. Todos eran damnificados del terremoto que desapareció Yungay en 1970. En la década del 80, se convirtió en bastión del narcotráfico y de Sendero Luminoso. En el proceso de pacificación, fue bombardeado por el Ejército, y hubo centenas de muertes. A pesar de todo, nunca logró desprenderse de la sombra del narcoterrorismo. Aún ahora, el pueblo lucha por reescribir su historia.

MONITOREO

Al cierre de mes, la toma de datos (puntos) con GPS de las parcelas de los agricultores que participan en el Proyecto Tocache IV Etapa muestran un significativo avance, en promedio 98% , en Abril se concluirá con el proceso.

Alternativo mediante la implementación de ***Planes Sociales***. A la fecha el Proyecto cuenta con tres planes que está en la fase de revisión para su próxima aplicación en las zonas de Tocache-Paraíso, Bolsón de Cuchara y Pongo de

Estado situacional de las georeferencias de las parcelas con cultivos promovidos por el Proyecto Tocache IV Etapa a Marzo 2012 (*)

Ambito de acción	Fase	Cultivos	Nivel de avance	Fecha de término
Tocache	I	Palma Aceitera	100%	
	II	Palma Aceitera -Cacao	100%	
	III	Palma Aceitera -Cacao-Pijuayo	100%	
	IV	Palma Aceitera -Cacao	100%	
Paraíso	III	Palma Aceitera	100%	
	IV (vivero)	Palma Aceitera	100%	
Aguaytía				
Socios de ASPASH		Palma Aceitera	99%	15 de Abril
Pongo de Caynarachi				
Socios de JARPAL		Palma Aceitera	85%	15 de Abril
	IV (vivero)	Palma Aceitera	100%	
Bolsón de Cuchara				
	IV	Café-Cacao-Reforestación	100%	

(*) El equipo técnico viene regularizando Adendas de inclusión y exclusión para determinar el stock real de familias participantes.

En cada zona de trabajo, los equipos técnicos responsable de la supervisión y asistencia técnica de los cultivos promovidos (café, cacao, pijuayo para palmito y palma aceitera) regularizan Adendas de inclusión y exclusión de participantes del Proyecto que por diversos motivos (abandono del cultivo, pérdida del cultivo por inundación, transferencias o venta de parcelas) no figuran en la lista inicial de beneficiarios. Esta actividad, determinará la nueva lista actualizada de familias participantes.

De otro lado, el Proyecto promueve el acceso y mayor participación de las entidades de apoyo social del Estado en las zonas de influencia del Desarrollo Caynarachi-Yurimaguas. Asimismo, está en proceso de elaboración conjunta el Plan Social para el sector de Aguayía-San Alejando-Divisoria, ámbitos de los proyectos Tocache IV Etapa y "*Desarrollo Agrícola Sostenible para Reducir la Pobreza a través del Enfoque Ambientalmente Sostenible y Empoderamiento de Género".*

AVANCE FINANCIERO

En Marzo, la inversión del Proyecto fue por US$250,000, en términos acumulados sumó US$ 4´261,876.65, cantidad que muestra un avance del 83.6% con respecto monto total desembolsado por USAID (US$ 5'096,407).

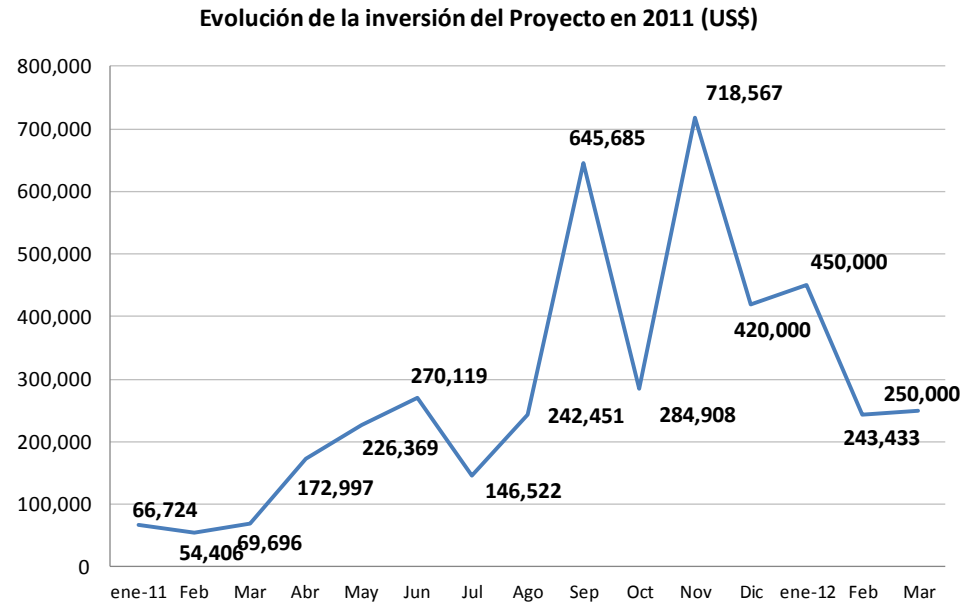

Fuente: Unidad de Finanzas y Administración de UNODC

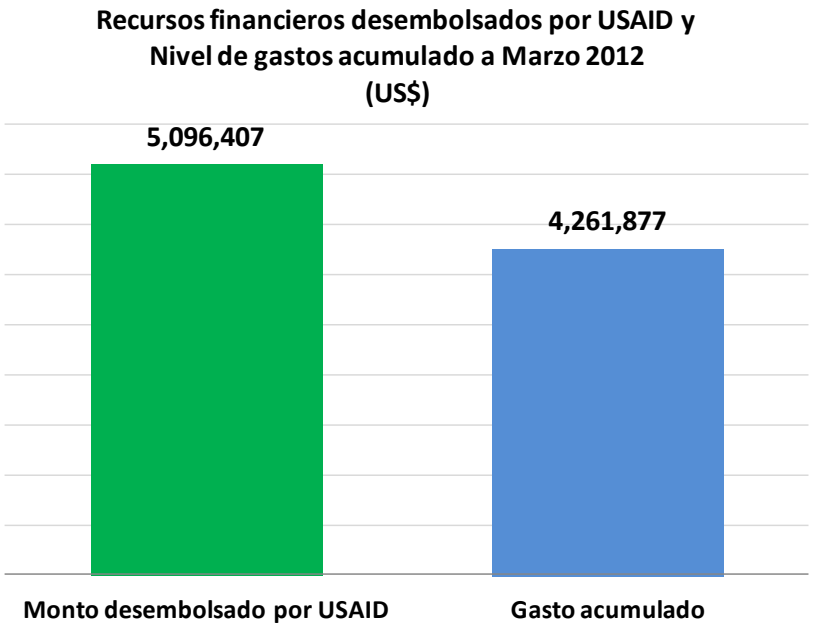

Fuente: Unidad de Finanzas y Administración de UNODC

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO TOCACHE IV ETAPA A MARZO 2012

ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIA	META GLOBAL PROYECTO (2011-2014)	AVANCE FÍSICO A FEBRERO 2012	LOGRO ACUMULADO A FEBRERO 2012 (%)	AVANCE FÍSICO A MARZO 2012	LOGRO ACUMULADO A MARZO 2012 (%)
A. FASE DE CONSOLIDACIÓN (Tocache-Paraíso)						
1. Culminación de siembras de la III Etapa						
a. Tocache - San Martín						
Área instalada en III Etapa	**Ha**	**1,501**	Concluido		Concluido	
Palma aceitera	Ha	501	Concluido		Concluido	
Cacao	Ha	800	Concluido		Concluido	
Palmito	Ha	200	Concluido		Concluido	
Número de familias beneficiadas en III Etapa	Cantidad	**764**	Concluido		Concluido	
Palma aceitera	Cantidad	172	Concluido		Concluido	
Cacao	Cantidad	430	Concluido		Concluido	
Palmito	Cantidad	162	Concluido		Concluido	
Comunidades beneficiadas en III Etapa						
Palma aceitera	Cantidad	24	Concluido		Concluido	
Cacao	Cantidad	16	Concluido		Concluido	
Palmito	Cantidad	27	Concluido		Concluido	

ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIA	META GLOBAL PROYECTO (2011-2014)	AVANCE FÍSICO A FEBRERO 2012	LOGRO ACUMULADO A FEBRERO 2012 (%)	AVANCE FÍSICO A MARZO 2012	LOGRO ACUMULADO A MARZO 2012 (%)
b. Paraíso-Huánuco						
Área instalada en III Etapa						
Palma aceitera	Ha	999	Concluido		Concluido	
Número de familias intervenidas	Cantidad	283	Concluido		Concluido	
Comunidades intervenidas	Cantidad	15	Concluido		Concluido	
2. Mantenimiento de plantaciones instaladas en la III Etapa						
a. Palma aceitera en Tocache-San Martín						
Mantenimiento de círculos	Ha	501	459	92%	669	134%
Mantenimiento de interlíneas	Ha	501	234	47%	385	77%
Fertilización	Ha	501			0	
Aplicación de Boro	Ha	501			0	
Precio de RFF de palma aceitera	US$/.x TM RFF		170	-3%	170	0%
Precio de aceite crudo de palma aceitera	US$/.x TM		1,079	10%	1,100	2%
Precio de palmiste	US$/.x TM		320	0%	320	0%

ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIA	META GLOBAL PROYECTO (2011-2014)	AVANCE FÍSICO A FEBRERO 2012	LOGRO ACUMULADO A FEBRERO 2012 (%)	AVANCE FÍSICO A MARZO 2012	LOGRO ACUMULADO A MARZO 2012 (%)
b. Palma aceitera en Paraíso-Huánuco						
Mantenimiento de círculos	Ha	999	462	46%	833	83%
Mantenimiento de interlíneas	Ha	999	359	36%	673	67%
Fertilización	Ha	999	0		0	
Aplicación de Boro	Ha	999	0		0	
c. Cacao en Tocache						
Injerto de patrones	Ha	**800**	Concluido		Concluido	
Cacao CCN51	Ha	560	Concluido		Concluido	
Cacao Fino Aromático	Ha	240	Concluido		Concluido	
Poda de formación de plantaciones	Ha	800	727	91%	747	93%
Control de Malezas	Ha	800	529	66%	753	94%
Reinjerto	Ha	79.9	16	20%	31	39%
Cacao Bajo sistema agroforestal	Ha	800	750.5	94%	781	98%
Sombra forestal de rápido crecimiento	Ha	800	0	71%	0	71%
Sombra forestal de lento crecimiento	Ha	800	0	69%	0	69%
Poda de mantenimiento	Ha	800	352	44%	747	93%
Poda fitosanitaria	Ha	800	401.5	50%	662	83%
Manejo integrado de plagas	Ha	800	422	53%	726	91%
Abonamiento de plantaciones	Ha	800	735.5	92%	0	92%

ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIA	META GLOBAL PROYECTO (2011-2014)	AVANCE FÍSICO A FEBRERO 2012	LOGRO ACUMULADO A FEBRERO 2012 (%)	AVANCE FÍSICO A MARZO 2012	LOGRO ACUMULADO A MARZO 2012 (%)
Infraestructura de post cosecha						
Entrega de cajones fermentadores	N° de cajones	430	Concluido		Concluido	
Protección del medioambiente						
Uso de abonos foliares	N° de productores	430	153	**36%**	215	50%
Preparación de compost	N° de productores	430	349	81%	354	82%
Construcción de microrellenos sanitario	N° de predios	430	0	0%	45	10%
Construcción de letrinas	N° de predios	430	430	100%	0	100%
Precio de cacao pagado al productor en Tocache						
En baba	S/. xkg		4.5	0.0%	4.6	2.2%
Grano seco	S/. xkg		5.2	4.0%	5.5	5.8%
d. Pijuayo para palmito en Tocache						
Deshierbo	Ha	**201.05**	**125.8**	66%	**135.2**	**71%**
Tocache	Ha	59.25	46.7	25%	49.9	85%
Uchiza	Ha	107.35	66.1	35%	73.5	72%
Nuevo Progreso	Ha	34.45	13.1	7%	11.8	41%
Abonamiento	Ha	**201.05**	**0.00**	0%	**0.00**	0%

ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIA	META GLOBAL PROYECTO (2011-2014)	AVANCE FÍSICO A FEBRERO 2012	LOGRO ACUMULADO A FEBRERO 2012 (%)	AVANCE FÍSICO A MARZO 2012	LOGRO ACUMULADO A MARZO 2012 (%)
Tocache	Ha	59.25	0.0	0%	0.0	0%
Uchiza	Ha	107.35	0.0	0%	0.0	0%
Nuevo Progreso	Ha	34.45	0.0	0%	0.0	0%
Abonos entregados a productores	**Sacos/50kg**		**0**		**0**	
Magnecal	Sacos/50kg		0		0	
Roca Fosfórica	Sacos/50kg		0		0	
Urea	Sacos/50kg		0		0	
Cluoruro de potasio	Sacos/50kg		0		0	
Guano de isla	Sacos/50kg		0		0	
Precio chonta de palmito pagado al productor	S/.x chonta		0.5	4.17%	0.5	0.00%
3. Instalación de cultivos nuevos						
a. Cacao en Santa Rosa de Mishollo- San Martín						
Área por instalar	Ha	200	184	92%	194	97%
Número de familias beneficiadas	Cantidad	119	Concluido		Concluido	
Comunidades beneficiadas	Cantidad	6	Concluido		Concluido	
Actividades agronómicas en área nueva de cacao						
Preparación de terreno	Ha	200	Concluido		Concluido	
Instalación de sombra temporal	Ha	200	Concluido		Concluido	
Viveros instalados	Predios	200	Concluido		Concluido	
Producción de plantones	N° plantones	240,000	Concluido		Concluido	

ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIA	META GLOBAL PROYECTO (2011-2014)	AVANCE FÍSICO A FEBRERO 2012	LOGRO ACUMULADO A FEBRERO 2012 (%)	AVANCE FÍSICO A MARZO 2012	LOGRO ACUMULADO A MARZO 2012 (%)
Construcción de composteras	Predios	119	0	0%	7	6%
Construcción de microrellenos sanitario	Predios	119	104	87%	0	87%
Construcción de letrinas	Predios	119	93	78%	97	82%
Uso de abonos foliares	Predios	119	119	100%	0	100%
Precio de cacao pagado al productor en Paraíso						
En baba	US$xkg		4.5	7%	4.6	2%
Grano seco	US$xkg		5.2	0%	5.5	6%
b. Palma aceitera en Paraíso-Huánuco						
b.1 Socialización						
Comunidades beneficiadas que firman Acta de Entendimiento	Cantidad	14	Concluido		Concluido	
Número de participantes que firmaron Acta de Entendimiento	Cantidad	167	Concluido		Concluido	
Hombre	Cantidad		Concluido		Concluido	
Mujer	Cantidad		Concluido		Concluido	
Área potencial para siembra de palma aceitera (verificada)	Ha	500	Concluido		Concluido	

ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIA	META GLOBAL PROYECTO (2011-2014)	AVANCE FÍSICO A FEBRERO 2012	LOGRO ACUMULADO A FEBRERO 2012 (%)	AVANCE FÍSICO A MARZO 2012	LOGRO ACUMULADO A MARZO 2012 (%)
b.2 Fase Vivero para 500 ha						
Compra de semilla germinada de palma a Palmera de los Andes S.A (Ecuador)	Unidad	90,000	Concluido		Concluido	
Vivero (Comunidad Culebra, 4 Km. CP Paraíso)	Unidad	1	Concluido		Concluido	
Semilla recepcionada en vivero	Unidad	90,000	Concluido		Concluido	
Semilla seleccionada	Unidad	94,456	Concluido		Concluido	
Número de plántulas emergidas	Unidad	91,552	88,385	0%	87,972	0%
Número de participantes que trabajan en viveros	Cantidad	167	**109**	**65%**	**109**	65%
Hombre	Cantidad		72		72	
Mujer	Cantidad		37		37	
Número de localidades/comunidades intervenidas	Cantidad	15	15		15	
B. APOYO A LAS ORGANIZACIONES						
1. Pijuayo para palmito						
a. Semilleros de Pijuayo						
Vivero para semilleros de pijuayo (ASLUSA y productores)	**Ha**	**20**	**Concluido**		**Concluido**	
Uchiza	Ha	15	Concluido		Concluido	
Nuevo Progreso	Ha	5	Concluido		Concluido	
Siembra en campo definitivo de plantones en vivero	**Ha**	**20**			3	15%
Uchiza	Ha	15			3	20%
Nuevo Progreso	Ha	5			0	0%

ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIA	META GLOBAL PROYECTO (2011-2014)	AVANCE FÍSICO A FEBRERO 2012	LOGRO ACUMULADO A FEBRERO 2012 (%)	AVANCE FÍSICO A MARZO 2012	LOGRO ACUMULADO A MARZO 2012 (%)
Número de localidades/comunidades participantes	Cantidad	**8**	**Concluido**		**Concluido**	
Uchiza	Cantidad	6	Concluido		Concluido	
Nuevo Progreso	Cantidad	2	Concluido		Concluido	
Número de beneficiarios participantes	Cantidad	**15**	**Concluido**		**Concluido**	
Uchiza	Cantidad	10	Concluido		Concluido	
Nuevo Progreso	Cantidad	5	Concluido		Concluido	
b. Fertilización de Pijuayo						
Area seleccionada para fertilizar	Ha	400	318	80%	323	81%
Área fertilizada (hasta enero 2012 se seleccionó 339 ha)	Ha	400	0	0%	0	0%
Número de familias beneficiarias	Cantidad		188		189	99%
Número de comunidades	Cantidad		Concluido		Concluido	
2. Cacao Fino Aromático (CFA)						
Organizaciones de cacao participantes en promoción CFA	Cantidad	4	Concluido			
Conformación de consorcio para CFA	Cantidad	1	Concluido			
Modulos de post cosecha	Cantidad	4	Concluido			
Número de productores beneficiarios capacitados	Cantidad		72			
Acopio de cacao fino para Convenio con Rausch	Kg		2,790			

ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIA	META GLOBAL PROYECTO (2011-2014)	AVANCE FÍSICO A FEBRERO 2012	LOGRO ACUMULADO A FEBRERO 2012 (%)	AVANCE FÍSICO A MARZO 2012	LOGRO ACUMULADO A MARZO 2012 (%)
Comercialización de cacao fino de Convenio con Rausch	Kg		0			
Precio de cacao fino aromático pagado al productor	US$		No acopio	0%	No acopio	0%
C. CONSOLIDACIÓN DE LA AGROINDUSTRIA DE LA PALMA ACEITERA						
1. Fortalecimiento de la actividad de palma en el Pongo de Caynarachi-San Martín						
a. Instalación de área nueva						
Fase Vivero para 700 ha						
Compra de semilla germinada de palma a Palmera de los Andes S.A (Ecuador)	Unidad	126,000	Concluido		Concluido	
Número de viveros para 700 ha. (San Miguel de Achanamiza)	Nº Viveros	1	Concluido		Concluido	
Semilla recepcionada en vivero	Unidad	126,000	Concluido		Concluido	
Semilla seleccionada	Unidad	132,300	Concluido		Concluido	
Número de plántulas emergidas	Unidad	130,161	122,283	94%	122,283	0%
Número de beneficiarios seleccionados para fase de vivero	Cantidad	**140**	Concluido		Concluido	
Pongo de Caynarachi	Cantidad		Concluido		Concluido	
Yurimaguas	Cantidad		Concluido		Concluido	

ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIA	META GLOBAL PROYECTO (2011-2014)	AVANCE FÍSICO A FEBRERO 2012	LOGRO ACUMULADO A FEBRERO 2012 (%)	AVANCE FÍSICO A MARZO 2012	LOGRO ACUMULADO A MARZO 2012 (%)
Número de localidades/comunidades beneficiadas	Cantidad	**14**	Concluido		Concluido	
Pongo de Caynarachi	Cantidad	9	Concluido		Concluido	
Yurimaguas	Cantidad	5	Concluido		Concluido	
-	-		-	-	-	-
b. Asistencia técnica a productores de palma aceitera en el Pongo de Caynarachi						
Mantenimiento de plantaciones de palma aceitera						
Mantenimiento de círculos		2,200	381	17%	489	22%
Mantenimiento de interlíneas		2,200	854.26	39%	966.16	44%
Abonamiento	Ha	2,200	0	0%	0	0%
Número de familias beneficiadas	Cantidad	383	250	65%	320	84%
Número de localidades/comunidades beneficiadas	Cantidad	**15**	15		15	
Pongo de Caynarachi	Cantidad	10	9		9	
Yurimaguas	Cantidad	5	6		6	
2. Fortalecimiento de la actividad de palma en Aguaytía-Ucayali						
a. Instalación de área nueva						
Fase Vivero para 800 ha						
Compra de semilla germinada de palma (800 ha)	Unidad	144,000	72,000	50%	72,000	50%

ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIA	META GLOBAL PROYECTO (2011-2014)	AVANCE FÍSICO A FEBRERO 2012	LOGRO ACUMULADO A FEBRERO 2012 (%)	AVANCE FÍSICO A MARZO 2012	LOGRO ACUMULADO A MARZO 2012 (%)
Compra de semilla germinada de palma a Palmera de los Andes S.A/Ecuador (400ha)	Unidad	72,000	Concluido		Concluido	
Número de viveros por habilitar para 800 ha. (año 1=400ha)	Nº Viveros	2	Concluido		Concluido	
Semilla recepcionada en vivero	Unidad	72,000	Concluido		Concluido	
Semilla seleccionada	Unidad	75,166	Concluido		Concluido	
Número de plántulas emergidas (Vivero N° 01 Localdiad, Mediación 400 ha)	Unidad	72,314	67,468	93%	66,757	-1%
Vivero N° 02 (por definir el año 2012), 400 ha	N° de plantones					
Número de beneficiarios seleccionados para vivero 01	Cantidad	160	125	78%	125	78%
Hombre	Cantidad		81		81	
Mujer	Cantidad		44		44	
Número de localidades/comunidades beneficiadas	Cantidad		14		14	
b. Campo definitivo						
Asistencia técnica a productores de palma aceitera en Aguaytía-Ucayali						
Área con palma aceitera en mantenimiento	Ha	2,284	2,054	90%	2,054	90%
Número de beneficiarios	Cantidad	366	366	100%	366	100%
Hombre	Cantidad	269	269	100%	269	100%
Mujer	Cantidad	97	97	100%	97	100%
Localidades beneficiadas	Cantidad	13	13	100%	13	100%

ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIA	META GLOBAL PROYECTO (2011-2014)	AVANCE FÍSICO A FEBRERO 2012	LOGRO ACUMULADO A FEBRERO 2012 (%)	AVANCE FÍSICO A MARZO 2012	LOGRO ACUMULADO A MARZO 2012 (%)
Labores culturales implementadas						
Plateo manual	Ha	2,219	475	21%	735	33%
Plateo químico	Ha	2,219	660	30%	1,015	46%
Interlíneas	Ha	2,219	842	38%	1,286	58%
Poda	Ha	2,219	388	18%	726	33%
3. Fortalecimiento de la actividad de palma en Tocache-San Martín						
a. Asistencia técnica a productores de palma aceitera en Tocache-San Martín						
Mantenimiento						
Limpieza de círculos	Ha	5,885			7,886	134%
Mantenimiento de interlíneas	Ha	5,885			6,356	108%
Número de beneficiarios	Cantidad	1,593	0	0%		
Hombre	Cantidad		0	0%		
Mujer	Cantidad		0	0%		
Localidades intervenidas	Cantidad		0	0%		

ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIA	META GLOBAL PROYECTO (2011-2014)	AVANCE FÍSICO A FEBRERO 2012	LOGRO ACUMULADO A FEBRERO 2012 (%)	AVANCE FÍSICO A MARZO 2012	LOGRO ACUMULADO A MARZO 2012 (%)
4. Estudios						
Estudio preliminar para entidad financiera (palma aceitera)	Nº estudio	1	Concluido		Concluido	
Estudio de factibilidad para entidad financiera (palma aceitera)	Nº estudio	1	0	0%	En proceso	
Estudio Mesa Redonda Sobre Aceite de Palma Sostenible (RSPO)	Nº estudio	1	0	0%	0	0%
Conformación de entidad líder ante RSPO	N° empresa	1	1	100%	0	100%
Estándar Fair Choice para OLPASA (auditoria)	N° empresa	1	0	0%	En proceso	
5. Capital social						
Diagnóstico de infraestructura deportiva	Estudio	1	Concluido		Concluido	
Número de centros deportivos en zonas palmicultoras	Cantidad	4	Concluido		Concluido	
Tocache	Cantidad	1	Concluido		Concluido	
Shambillo-Aguaytía	Cantidad	1	Concluido		Concluido	
Pongo de Caynarachi	Cantidad	1	Concluido		Concluido	
Neshuya	Cantidad	1	Concluido		Concluido	

ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIA	META GLOBAL PROYECTO (2011-2014)	AVANCE FÍSICO A FEBRERO 2012	LOGRO ACUMULADO A FEBRERO 2012 (%)	AVANCE FÍSICO A MARZO 2012	LOGRO ACUMULADO A MARZO 2012 (%)
Número de niños/jóvenes beneficiados (6-18 años)	Cantidad		Concluido		Concluido	
Tocache	Cantidad		Concluido		Concluido	
Shambillo-Aguaytía	Cantidad		Concluido		Concluido	
Pongo de Caynarachi	Cantidad		Concluido		Concluido	
Neshuya	Cantidad		Concluido		Concluido	
Número de niñas/jovenes beneficiado (6-18 años)	Cantidad		Concluido		Concluido	
Tocache	Cantidad		Concluido		Concluido	
Shambillo-Aguaytía	Cantidad		Concluido		Concluido	
Pongo de Caynarachi	Cantidad		Concluido		Concluido	
Neshuya	Cantidad		Concluido		Concluido	
D. MANEJO FORESTAL						
Plan de manejo y aprovechamiento forestal para Aguaytía	Nº plan	1	0	0%	0	0%
Número de beneficiarios que participan en el plan de manejo forestal	Cantidad		0	0%	0	0%
Hombre	Cantidad		0	0%	0	0%
Mujer	Cantidad		0	0%	0	0%
Número de comunidades/localidades beneficiadas	Cantidad		0	0%	0	0%
Superficie considerado para aprovechamiento forestal sostenible	Ha		0	0%	0	0%
Volumen de secado de madera	p3	540,000	0	0%	0	0%
-	-	-	-	-	-	-

ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIA	META GLOBAL PROYECTO (2011-2014)	AVANCE FÍSICO A FEBRERO 2012	LOGRO ACUMULADO A FEBRERO 2012 (%)	AVANCE FÍSICO A MARZO 2012	LOGRO ACUMULADO A MARZO 2012 (%)
E. POST ERRADICACIÓN EN BOLSÓN DE CUCHARA						
1. Proceso de socialización						
Comunidades beneficiadas que firman Acta de Entendimiento	Cantidad	**25**	**Concluido**		**Concluido**	
Café	Cantidad		Concluido		Concluido	
Cacao	Cantidad		Concluido		Concluido	
Reforestación	Cantidad		Concluido		Concluido	
Número de beneficiarios que firmaron Acta de Entendimiento		**800**	**Concluido**		**Concluido**	
Café	Cantidad	**150**	Concluido		Concluido	
Hombre	Cantidad		Concluido		Concluido	
Mujer	Cantidad		Concluido		Concluido	
Cacao	Cantidad	**400**	**Concluido**		**Concluido**	
Hombre	Cantidad		Concluido		Concluido	
Mujer	Cantidad		Concluido		Concluido	
Reforestación	Cantidad	**250**	**Concluido**		**Concluido**	
Hombre	Cantidad		Concluido		Concluido	
Mujer	Cantidad		Concluido		Concluido	
Áreas potenciales para instalar el cultivo propuesto		**1,600**	**Concluido**		**Concluido**	
Café	Ha	300	Concluido		Concluido	

ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIA	META GLOBAL PROYECTO (2011-2014)	AVANCE FÍSICO A FEBRERO 2012	LOGRO ACUMULADO A FEBRERO 2012 (%)	AVANCE FÍSICO A MARZO 2012	LOGRO ACUMULADO A MARZO 2012 (%)
Cacao	Ha	800	Concluido		Concluido	
Reforestación	Ha	500	Concluido		Concluido	
-	-	-	-	-	-	-
2. Fase de implementación del Proyecto						
2.1 Número de beneficiarios	Cantidad	**800**	**637**	**80%**	**673**	**84%**
2.2 Comunidades/localidades participantes	Cantidad	**25**	**21**	**84%**	**21**	**84%**
3. Actividades desarrolladas por equipo técnico en campo						
Café						
Número de beneficiarios	Cantidad	**150**	**160**	**107%**	**160**	**107%**
Hombre	Cantidad		121		121	
Mujer	Cantidad		39		39	
Número de comunidades participantes	Cantidad	14	Concluido		Concluido	
Adquisición de semillas de café	Kg	1,200	Concluido		Concluido	
Transporte y distribución de semillas	Kg	1,200	Concluido		Concluido	
Distribución de fertilizantes						
Guano de isla	TM	90.0	0	0%		
Ecomaster	TM	112.5	0	0%		
Ulexita	TM	1.5	0	0%		
Magnecal	TM	3.0	0	0%		
Sulfato de potasio	TM	8.0	0	0%		

ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIA	META GLOBAL PROYECTO (2011-2014)	AVANCE FÍSICO A FEBRERO 2012	LOGRO ACUMULADO A FEBRERO 2012 (%)	AVANCE FÍSICO A MARZO 2012	LOGRO ACUMULADO A MARZO 2012 (%)
Sulfato de cobre	TM	0.2	0	0%		
Sulfato de zinc	TM	0.2	0	0%		
Sulfato de magnesio	TM	0.2	0	0%		
Cal Agrícola	TM	0.3	0	0%		
Capacitaciones	N° eventos	36				
Vivero						
Instalación y verificación de germinadores	Unidad	300	269	90%	0	90%
Repique de plántulas de café	Ha	300	251	84%	0	84%
Limpieza y trazado para viveros	Unidad	300	251	84%	0	84%
Preparación de sustrato (desinfección de vivero)	Unidad	300	251	84%	0	84%
Llenado de bolsas	Ha	300	251	84%	0	84%
Manejo de viveros	Unidad	300	251	84%	0	84%
Campo definitivo						
Rozo y limpieza de terreno	Ha	300	222	74%	0	74%
Instalación de sombra temporal	Ha	300	189	63%	0	63%
Instalación de sombra permanente	Ha	300	227	76%	0	76%
Instalación de café en campo definitivo	Ha	300	20	7%	66	22%
Floricultura						
Compra de hijuelos	Unidad	39,900	0	0%	0	0%
Transporte y distribución de hijuelos	Unidad	39,900	0	0%	0	0%
Asistencia técnica en manejo de plantación	Ha	300	0	0%	0	0%

ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIA	META GLOBAL PROYECTO (2011-2014)	AVANCE FÍSICO A FEBRERO 2012	LOGRO ACUMULADO A FEBRERO 2012 (%)	AVANCE FÍSICO A MARZO 2012	LOGRO ACUMULADO A MARZO 2012 (%)
Cacao						
Número de beneficiarios	Cantidad	**400**	**450**	**113%**	**461**	**115%**
Hombre	Cantidad		331		337	
Mujer	Cantidad		119		124	
Número de comunidades participantes	Cantidad	19	Concluido		Concluido	
Adquisición de semillas	Kg	4,000	Concluido		Concluido	
Adquisición de hijuelos de plátano	Unidad	500,000	434,688	87%	444,688	89%
Adquisición de varas	Unidad	355,520	21,060	6%	39,000	11%
Distribución de fertilizantes						
Guano de isla	TM	13.6	0	0%		
Ulexita	TM	4.5	0	0%		
Magnecal	TM	13.6	0	0%		
Sulfato de potasio	TM	4.0	0	0%		
Sulfato de cobre	TM	0.3	0	0%		
Sulfato de zinc	TM	0.3	0	0%		
Roca fosfórica	TM	40.0	40	100%		
Magneso natural	TM	0.3	0	0%		
Vivero						
Instalación de tinglado	Unidad	450	Concluido		Concluido	
Instalación del vivero	Unidad	450	Concluido		Concluido	
Llenado de bolsas	Millar	960,000	Concluido		Concluido	
Producción de plantones	Unidad	960,000	Concluido		Concluido	

ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIA	META GLOBAL PROYECTO (2011-2014)	AVANCE FÍSICO A FEBRERO 2012	LOGRO ACUMULADO A FEBRERO 2012 (%)	AVANCE FÍSICO A MARZO 2012	LOGRO ACUMULADO A MARZO 2012 (%)
Campo definitivo						
Preparación de terreno	Ha	800	773	97%	0	97%
Siembra sombra temporal	Ha	800	696	87%	0	87%
Siembra sombra definitivo	Ha	800	415	52%	0	52%
Instalación de cacao en campo definitivo	Ha	800	315	39%	394	49%
Injertado en campo definitivo	Ha	800	85	11%	100	13%
Número de capacitaciones	N° eventos	36	71	197%	75	208%
Reforestación						
Número de beneficiarios	Cantidad	**250**	**27**	**11%**	**52**	**21%**
Hombre	Cantidad		21		37	
Mujer	Cantidad		6		15	
Número de comunidades participantes	Cantidad	21	11	52%	11	52%
Adquisición de semillas forestales	Kg	2,000	5	0%	0	0.25%
Distribución de fertilizantes						
Guano de isla	TM	97.00	0	0%		
Roca fosfórica	TM	54.85	54.85	100%		
Vivero						
Construcción de vivero	Unidad	2	Concluido		Concluido	
Preparación de sustrato	M^3	800	125	16%	175	22%
Llenado de bolsas	Unidad	400,000	52,000	13%	77,146	19%

ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIA	META GLOBAL PROYECTO (2011-2014)	AVANCE FÍSICO A FEBRERO 2012	LOGRO ACUMULADO A FEBRERO 2012 (%)	AVANCE FÍSICO A MARZO 2012	LOGRO ACUMULADO A MARZO 2012 (%)
Repique de plántulas	Unidad	400,000	19,500	5%	46,825	12%
Producción de plantones	Unidad	200,000	0	0%	0	0%
Campo definitivo						
Preparación de terreno	Ha	310	0	0%	0	0%
Instalación en campo definitivo	Ha	310	0	0%	0	0%
Capacitación	Evento	8	4	50%	0	50%
3. Apoyo Municipalidad Castillo Grande						
Elaboración de Plan de desarrollo comunal-Municipalidad del Centro Poblado Castillo Grande	Nº de plan	1	0	0%		
Entidades del Estado participantes en plan de desarrollo	Cantidad	1	0	0%		
3.1 Infraestructura vial para Bolsón de Cuchara						
Expediente técnico de rehabilitación de la carretera Castillo Grande - Venenillo	Nº Expediente	1	Concluido		Concluido	
Extensión vial rehabilitada, carretera Castillo Grande-Venenillo	Km	40	20	50%	0	50%
Número de familias beneficiadas con la rehabilitación de la carretera	Cantidad	1,000	286	29%	0	29%
Número de comunidades beneficiadas con la rehabilitación de la carretera	Cantidad	21	6	29%	0	29%

ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIA	META GLOBAL PROYECTO (2011-2014)	AVANCE FÍSICO A FEBRERO 2012	LOGRO ACUMULADO A FEBRERO 2012 (%)	AVANCE FÍSICO A MARZO 2012	LOGRO ACUMULADO A MARZO 2012 (%)
F. PLAN DE EMERGENCIA - REGIÓN UCAYALI						
1.Distribución de semillas a familias afectadas						
Arroz	TM	75	Concluido		Concluido	
Maíz amarillo duro	TM	28	Concluido		Concluido	
Frijol Ucayalino	TM	10	Concluido		Concluido	
Frijol Chiclayo	TM	7	Concluido		Concluido	
Hijuelos de plátano	Unidad	222,200	Concluido		Concluido	
2. Número de beneficiarios atendidos con semillas						
Arroz	Cantidad	987	Concluido		Concluido	
Maíz amarillo duro	Cantidad	1,157	Concluido		Concluido	
Frijol Ucayalino	Cantidad	716	Concluido		Concluido	
Frijol Chiclayo	Cantidad	484	Concluido		Concluido	
Hijuelos de plátano	Cantidad	200	Concluido		Concluido	
3. Comunidades beneficiadas						
Arroz	Cantidad	63	Concluido		Concluido	
Maíz amarillo duro	Cantidad	89	Concluido		Concluido	
Frijol Ucayalino	Cantidad	66	Concluido		Concluido	
Frijol Chiclayo	Cantidad	56	Concluido		Concluido	
Hijuelos de plátano	Cantidad	13	Concluido		Concluido	
3. Superficie agrícola por instalar						
Arroz	Ha	1,875	Concluido		Concluido	
Maíz amarillo duro	Ha	1,120	Concluido		Concluido	
Frijol Ucayalino	Ha	400	Concluido		Concluido	

ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIA	META GLOBAL PROYECTO (2011-2014)	AVANCE FÍSICO A FEBRERO 2012	LOGRO ACUMULADO A FEBRERO 2012 (%)	AVANCE FÍSICO A MARZO 2012	LOGRO ACUMULADO A MARZO 2012 (%)
Frijol Chiclayo	Ha	280	Concluido		Concluido	
Hijuelos de plátano	Ha	200	Concluido		Concluido	
4. Estudio de vulnerabilidad y riesgo para Región Aguaytia						
Estudio	Cantidad	1	En proceso	0.00%	En proceso	
G. COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN DEL DESARROLLO ALTERNATIVO						
1. Comunicación y mercadeo social						
Número de noticias de eventos y actividades en los medios comunicación	Cantidad					
Lanzamiento del Proyecto con participación de medios de comunicación	Nº de eventos	3				
Elaboración de videos sobre Bolsón de Cuchara	Cantidad	1				
Preparación y difusión de spots radiales	Cantidad	3				
2. Políticas y estrategías de comunicación institucional						
Número de entidades de comunicación de sector público articuladas con UNODC en la lucha contra el narcotráfico	Nº de entidades	10				

ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIA	META GLOBAL PROYECTO (2011-2014)	AVANCE FÍSICO A FEBRERO 2012	LOGRO ACUMULADO A FEBRERO 2012 (%)	AVANCE FÍSICO A MARZO 2012	LOGRO ACUMULADO A MARZO 2012 (%)
Número de entidades de comunicación de sector privado articuladas con UNODC en la lucha contra el narcotráfico	Nº de entidades	10				
Número de entidades de comunicación de la cooperación internacional articuladas con UNODC en la lucha contra el narcotráfico	Nº de entidades	3				
Encuentro nacional de comunicadores de las cuencas cocaleras	Cantidad	1				
3. Advocacy y fortalecimiento de capacidades						
Protocolo de intervención para la gestión preventiva de conflictos en zonas cocaleras	Nº protocolo	1				
Elaboración de mapa de actores del Estado vinculado con el D.A	N° mapa	1				
4. Gestión del conocimiento						
Estudio de sistematización del Modelo San Martín con metodología BID	Nº de estudios	1				
Estudio sobre valoración por deforestación de RRNN en la Región San Martín	Nº de estudios	1				

H. MONITOREO Y EVALUACIÓN						
Plan de Monitoreo & Evaluación del Proyecto	Nº plan	1				
Registro de productores en campo para la Línea Base	Nº productores	3,551	Concluido		Concluido	
Estudio de Línea Base del Proyecto	Nº de estudios	1	En proceso		En proceso	
Informe mensual de avance de las actividades de monitoreo	Nº de informes	31	8	26%	9	29%
Registro de familias participantes por acción del Proyecto	Nº de familias	5,500	En proceso		En proceso	
Informe sobre desempeño comercial de las empresas del D.A	Nº de informes	3	0	0%	En proceso	
I. AVANCE FINANCIERO						
Financiamiento para 03 años de intervención	US$	10,000,000				
Financiamiento aprobado para 2011	US$	5,290,553				
Monto total desembolsado en 2011 en (US$1´634,255.03+US$ 208,737.43 + US$ 284.907.65+2´250,000+718, 506.97)	US$	5,096,407	243,432.73	79%	250,000.00	83.6%
-	-	-	-	-	-	-

Semáforo de avance de actividades a Marzo 2012:

CONCLUIDO **EN PROCESO** **DEMORAD0**
